

电缆敷设施工日常记录与填写

为确保电缆敷设施工的质量和进度,需要对每个工作日的施工情况进行详细记录和分析,并及时发现问题,采取有效措施。本日常记录表涵盖了从施工日期、地点、天气到人员、内容、进度等各个方面,全面记录施工过程中的重要信息。

 魏老师

施工日期

1. 记录施工的具体日期, 包括年、月、日。
2. 注明该日期是整个工程中的第几天。
3. 如果遇到节假日等特殊情况, 也要如实记录。

施工地点

1. 详细记录施工作业的具体位置,包括地理位置、路名、门牌号等。
2. 如果是城市大型工程,还需要标注街道、区域、地标等信息。
3. 对于长距离的电缆敷设,可以分段标注多个施工地点。

施工天气

1. 详细记录当天的天气状况,包括温度、风力、降水等情况。
2. 评估天气对施工进度和质量的影响,如强风、暴雨等恶劣天气可能会造成安全隐患。
3. 记录任何导致工期延误或作业中断的极端天气,并提出应对措施。

施工人员




项目经理

负责整体施工任务的统筹安排,确保工程进度和质量目标的实现。




电工班组

专业的电缆敷设作业人员,熟悉电缆施工工艺和安全操作规程。



现场监理

负责现场施工过程的质量监督和安全检查,及时发现和解决问题。



施工工人

参与实际的电缆敷设、管沟开挖等土建作业,配合电工完成施工任务。

施工内容

本次电缆敷设工程包括以下主要施工内容：

管沟开挖

首先由施工工人使用机械和人工配合，按设计要求开挖电缆敷设管沟。管沟深度和宽度要求严格符合规范，确保电缆有足够的覆土和保护。


电缆铺设

专业电工团队负责将电缆沿管沟中心线铺设到位，并采取适当的绝缘、防护措施，确保电缆安全可靠。

管沟回填

施工工人将管沟依次分层回填并夯实，确保电缆受力均匀，防止日后管沟沉降。最后在地面恢复原有路面或绿化。


施工进度

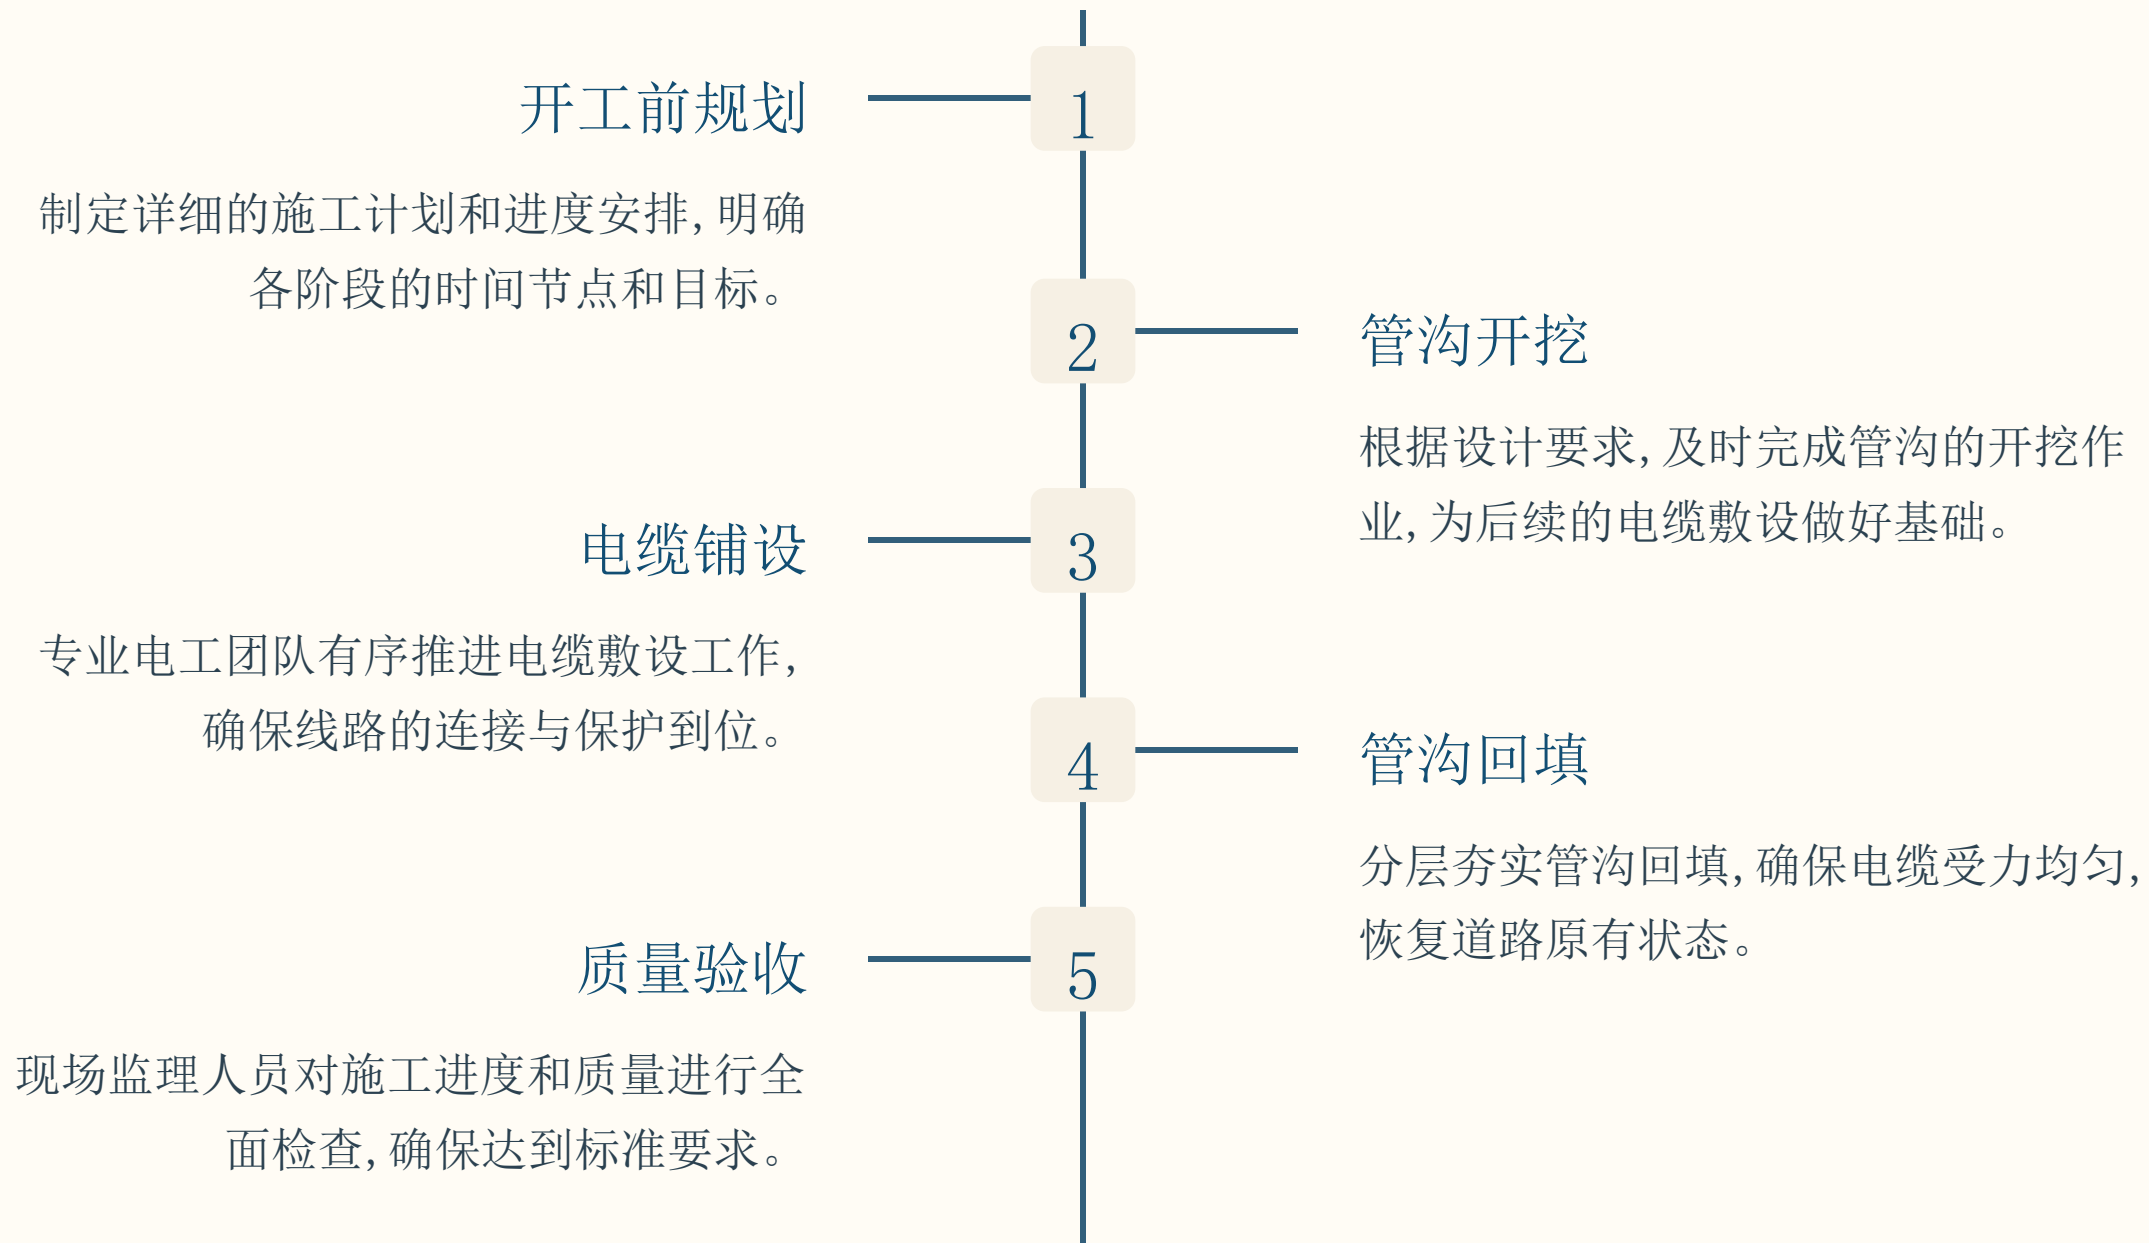

施工难点

1. 电缆线路在城市道路中敷设, 必须协调多方利益相关方, 如交通部门、市政管线单位等, 确保施工不影响城市正常运转。
2. 部分路段地下管线密集, 需要仔细探测和确认位置, 避免对现有管线造成损坏或危险。
3. 遇到老旧建筑物和大型地下建构筑物时, 电缆管沟开挖受限, 需要采取特殊工艺和技术保护。

施工质量

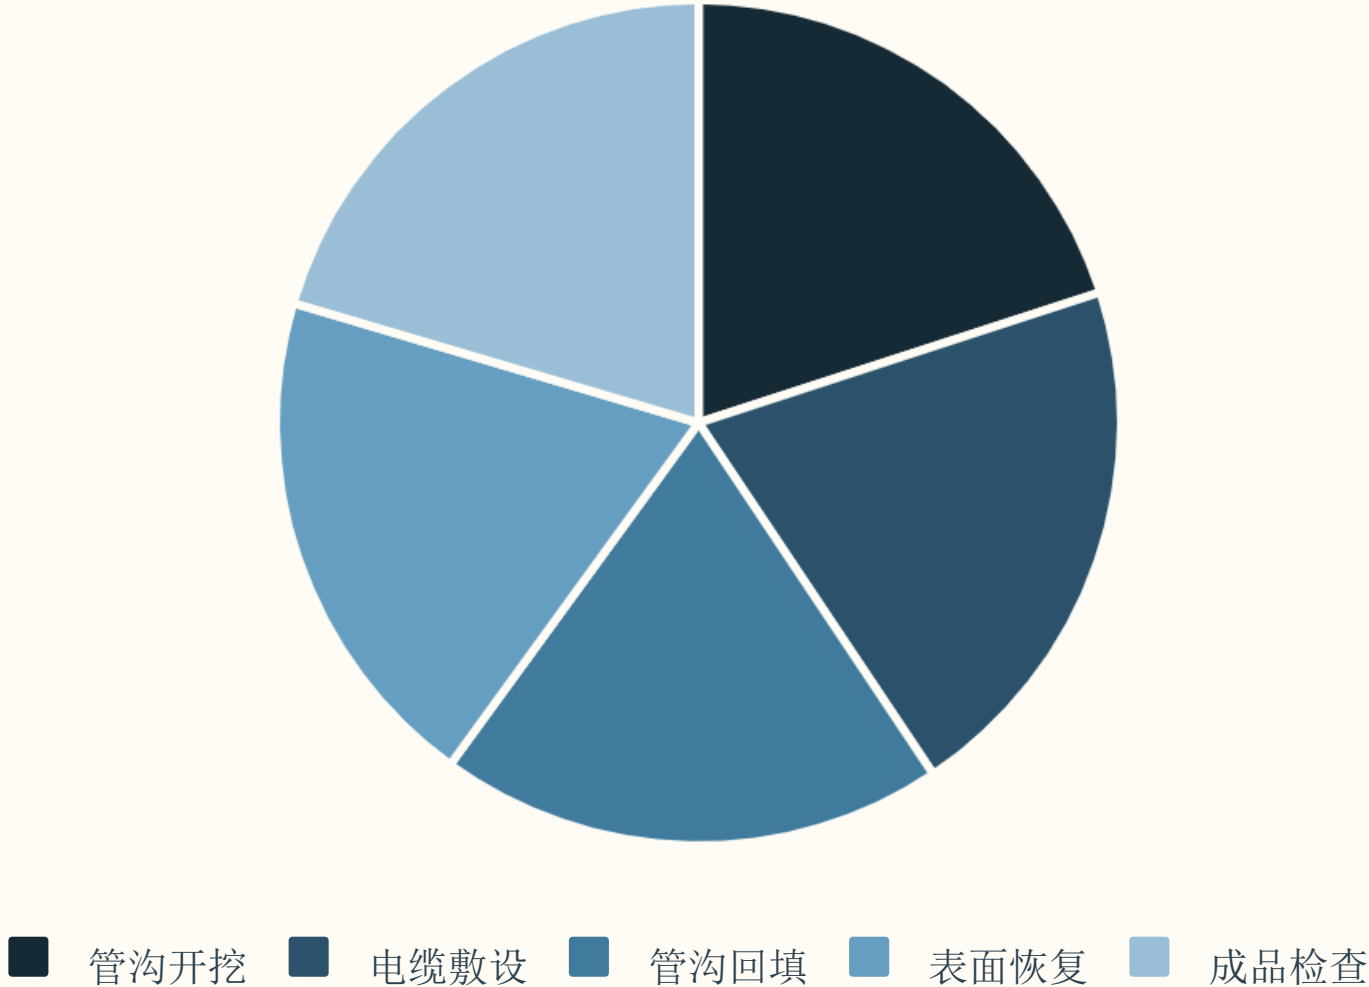

根据质量监理工作记录,本次电缆敷设施工的各项质量指标均较高,其中管沟开挖和电缆敷设的合格率最高,达到95%以上。管沟回填和表面恢复略有下降,需要加强现场工艺指导和质量控制。总体质量状况良好,确保了电缆线路的安全可靠性。

安全措施



个人防护

施工人员必须佩戴安全帽、手套、反光衣等防护装备,确保安全工作。



现场标识

在施工区域设置明显的警示标志和警戒线,提醒行人和车辆注意安全。



吊装作业

吊装电缆等重物时,使用专业吊装设备并由经验丰富的操作人员实施。



急救准备


现场设置应急救援物品和医疗急救设备,确保能及时应对意外伤害。

材料消耗

材料名称	单位	数量
电力电缆	米	3,500
电缆护套管	米	3,500
石英砂	吨	120
粘合剂	桶	20
标志警示带	卷	50


根据施工过程中的实际消耗情况,本次电缆敷设工程共使用3,500米电力电缆及同等长度的电缆护套管。还投入了120吨石英砂和20桶粘合剂用于管沟回填及电缆固定,并铺设了50卷标志警示带。所有材料均符合设计和规范要求,确保线路安全可靠。

机械设备




大型挖掘机

用于快速高效地开挖电缆管沟, 保证深度和宽度满足规范要求。




管沟夯实机

对管沟回填土进行分层夯实, 确保电缆受力均匀, 防止沉降。



电缆敷设机

专业电缆铺设设备, 可快速安全地将电缆排放到指定位置。



电缆吊装机

使用吊装设备安全高效地将重型电缆卷筒转运到施工现场。

施工工艺

1

系统规划

根据现场勘察和设计要求,制定详细的施工方案,明确各工序的流程和时序。

2

管沟开挖

采用大型机械和人工配合,按照规范深度和宽度要求开挖电缆管沟。

3

电缆敷设

专业电工团队小心翼翼地将电缆沿管沟中心线铺设,并采取保护措施。

4

管沟回填

分层夯实管沟回填,确保电缆受力均匀,恢复原有地面状态。

5

质量验收

现场监理全面检查,确保施工质量达到设计和规范要求。

现场问题

1. 部分路段地下管线密集, 电缆开槽受阻, 需采取特殊施工工艺避免对现有管线造成损坏。
2. 现场土质较为松软, 部分管沟回填质量不达标, 需要加强现场监督和管理。
3. 遇到临时停车位和限时道路, 施工作业受到限制, 需要与当地交通管理部门密切沟通协调。

现场照片

施工现场照片捕捉了电缆敷设各个阶段的关键过程。从开挖管沟、铺设电缆到管沟回填,工人们严格按照规程操作,确保线路安全可靠。吊装设备、夯实机、专业电缆敷设机等施工装备有序协作,体现了专业水平。监理人员全程跟踪检查,并对现场情况进行详细记录。整个施工现场井然有序,充分体现出公司的管理能力。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227065014113006106>
