目　录

一、工程概况 2
二、平安文明施工目标及保证体系 2
〔一〕、平安文明施工方针目标 2
〔二〕、建立工程部平安文明施工领导小组 2
三、平安文明施工保证体系工程平安管理组织体系及职责 3
四、平安施工保证措施 9
〔一〕、平安生产组织措施 10
〔二〕平安生产技术措施 10
五、文明施工保证措施 13
〔一〕、施工现场保证措施 13
1、生活区管理 13
2、施工现场管理区管理 14
〔二〕、夜间施工保证措施 16
〔三〕、环境保护措施 16
1、环境绿化、消防 16
2、噪声污染防治措施 16
3、粉尘污染防治措施 17
4、水污染的控制措施 17
〔四〕、地方关系的协调 17
〔五〕、交通组织方案 17
1、场地交通现状和解决方法 17
2、交通疏解措施 18
六、平安施工制度 18
〔一〕、工程平安事故处理制度 18
〔二〕、平安检查制度： 19
〔三〕、平安教育制度 19
〔四〕、平安生产奖惩制度 20
〔五〕、工人班组班前平安活动制度 20
〔六〕、平安技术交底制度 21
七、文明施工制度 22
〔一〕、执行文明施工制度 22
〔二〕、制定文明施工例会制度 22
〔三〕、各文明施工制度汇编 23
1、门卫制度 23
2、宿舍管理制度 23
3、消防制度 23
4、厨房卫生制度 24
5、文明施工责任制度、检查制度、奖罚制度 25
6、卫生管理制度 25
7、治安保卫制度 25

一、工程概况

本工程是位于广东省深圳市龙岗区龙城街道，总建筑面积约 10560㎡设计标高±0.00 相当于 1985 黄海高程 43.45 米。本工程为钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑长 48.75 米 、宽 36.00 米、建筑总高度为 24.3 米、地下 1 层、地上 5 层，层高 4.2 米，主要结构跨度 8.1×8.1 米

二、平安文明施工目标及保证体系

〔一〕、平安文明施工方针目标

本工程施工平安总目标为:

杜绝重大伤亡事故,实现“五无”〔无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾〕工程;

本工程文明施工总目标为:

创立文明示范工地，不扰民、不受民扰。到达市文明施工样板工地。

工程部认真贯彻和执行公司的有关平安文明施工规定和要求，建立健全的规章制度，把平安文明施工纳入正常化、制度化、科学化的管理轨道，严格执行《广东省建设工程文明施工假设干规定》和《深圳市建设工程现场施工管理方法》、《施工现场综合治理作业指导书》、《建筑施工平安检查标准》、GB/T2800－2000 职业健康、平安卫生管理标准。

〔二〕、建立工程部平安文明施工领导小组

为确保平安文明施工及环境保护目标的实现，我工程经理部成立“平安文明施工领导小组”，成员由工程经理部各部门负责人组成，负责本工程平安文明施工管理制度的制定、落实，并实施周检制度。专职的平安文明施工督导员，将全面负责监控本工程的平安文明施工工作。周检和月检制度按照我司质量体系工作文件《平安文明施工管理规定》内容落实。

平安文明施工领导小组的人员名单具体如下：

组　　长：管国海

副组长：孙晓波

组　　员：张琪、梁显斌、陈风华，

三、平安文明施工保证体系工程平安管理组织体系及职责

一、平安文明管理组织体系：

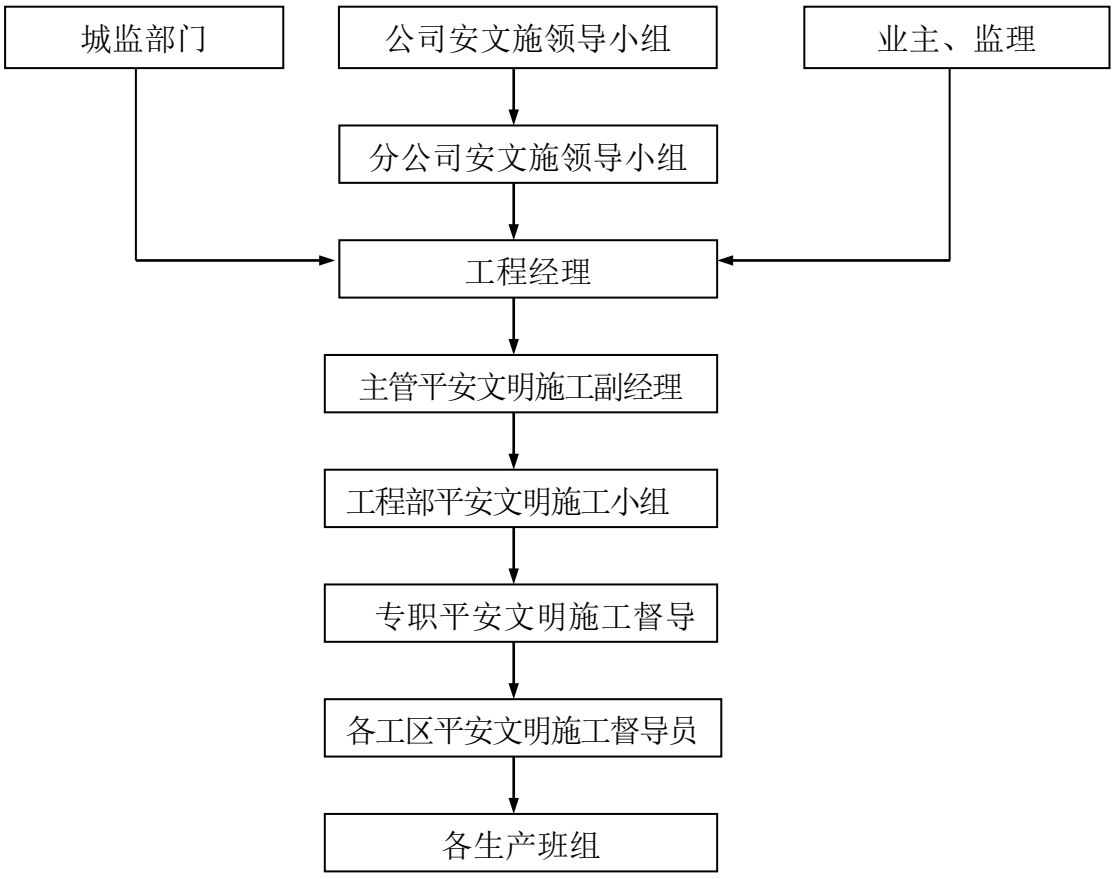

一、职责：

工程经理〔工程平安第一责任人〕平安职责：

〔1〕、负责贯彻执行国家及上级有关平安生产的方针、政策、法律、法规、批示和决定。

〔2〕、催促本工程工程技术人员、工长及班组长在各工程的职责范围内做好平安工作，不违章指挥。

〔3〕、组织制定或修订工程平安管理制度和平安技术规程，编制工程平安技术措施方案并组织实施。

〔4〕、在组织工程工程业务承包，确定平安工作的管理体制，明确各业务承包人的平安责任和考核指标，支持、指导平安管理人员的工作。

〔5〕、健全和完善用工管理手续，录用外包队必须经公司批准。认真做好专业队和上岗人员平安教育，保证他们的健康和平安。

〔6〕、组织落实施工组织设计中平安技术措施，组织并监督工程工程施工中平安技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

〔7〕、领导、组织施工现场定期的平安生产检查，发现施工生产中不平安问题组织制定措施，及时解决。对上级提出的生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决。

〔8〕、不打折扣地提取和用好平安防护措施费，落实各项平安防护措施，实行工地平安达标。

〔9〕、每天亲临现场巡查工地，发现问题通过整改指令书向工长或班组长交待。

〔10〕、定期召开工地平安工作会，当进度与平安发生矛盾时，必须服从平安。

〔11〕、发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事故的调查，认真制定防范措施，从而吸取事故教训。

〔12〕、要催促落实三级平安教育工作和组织工人参加“平安卡”培训教育领取平安卡，落实平安卡制度。

施工主管〔工程平安生产直接责任人〕平安职责：

〔1〕、认真执行本企业的领导和平安部门在平安生产方面的指示和规定，对本工程的职工在生产中的平安负全面责任。

〔2〕、方案、布置、检查、总结和评比平安生产工作。

〔3〕、经常检查生产现场和建筑物、机械设备及其平安装置、钢管架、工夹具、原材料、成品、工作地点以及生活设施等是否符合平安卫生要求。

〔4〕、按时提出本工程平安技术措施方案工程，经上级批准后负责对措施工程的实施。

〔5〕、制定和修订本工程的平安管理制度，经平安科审查，提出意见，企业主管领导或安委会批准后负责执行。

〔6〕、经常对本工程部职工进行平安生产思想和技术教育，对新调入工程的工人进行平安生产现场教育；对特种作业的工人，必须严格训练，经考试合格，并持有操作合格证，方可独立操作。

〔7〕、发生事故时，应及时向主管领导和平安部门报告，并协助企业领导和

平安部门进行事故的调查、登记和分析处理工作。

〔8〕、开展各项平安管理工作，制定具体的平安管理措施。

〔9〕、定期向平安第一责任人填报季度报告书。

技术负责人平安职责：

〔1〕、对工程生产的平安生产负技术责任。

〔2〕、贯彻落实平安生产方针、政策，严格执行平安技术规程、标准、标准。结合工程工程特点，主持工程工程的平安技术交底。

〔3〕、参加或组织编制施工组织设计、编制、审查施工方案时，要制定、审查平安技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实。

〔4〕、主持制定技术措施、制定季节性施工方案的同时，制定相应的平安技术措施并监督执行，及时解决执行中出现的问题。

〔5〕、工程工程应用新技术、新工艺、新材料要及时上报，经批准前方可实施，同时要组织上岗人员的平安技术培训、教育，认真执行相应的平安技术措施与平安操作工艺要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其工艺实施中可能造成的事故。

〔6〕、主持平安防护设施和设备的验收，发现不正常情况应及时采取措施。严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用。

〔7〕、参加平安生产检查，对施工中存在的不平安因素从技术方面提出整改意见和方法予以消除。

〔8〕、参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因平安检查，掌握平安生产情况，查出平安隐患及时提出整改意见和措施制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

平安员的职责：

〔1〕、认真执行国家有关平安生产方针、政策和企业各项规章制度。

〔2〕、催促工程财务提足平安技术措施费，做到专款专用。

〔3〕、每天对各施工作业点进行平安检查，掌握平安生产情况，查出平安隐患及时提出整改意见和措施制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

〔4〕、参加工程组织的定期平安检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，并催促认真进行整改。

〔5〕、配合工长开展好平安宣传教育活动，特别是要坚持每周一次的平安活动制度，组织班组认真学习平安技术操作规程。

〔6〕、对劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的发放使用情况进行监督检查。

〔7〕、发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报，并如实向事故调查组反映事故情况。

〔8〕、提出平安事故处理意见，并报主管部门。

施工员的平安职责：

〔1〕、认真执行国家有关平安生产的方针、政策和企业的各项规章制度。

〔2〕、向班组下达施工任务前，认真向班组进行平安和质量技术交底，并填写平安技术交底单，履行签名手续，交底一式两份，交底双方各一份。

〔3〕、每天对安排施工任务的作业点进行检查，查出平安隐患及时进行整改并制止违章作业，遇有险情及时停止生产并向上级报告。

〔4〕、接受上级及平安监督员的监督检查，对上级及平安监督员提出的平安隐患及时安排整改，并监督整改的落实情况。

〔5〕、定期对工人进行平安技术教育，防患于未然。

〔6〕、领取和发放使用好班组的劳动保护用品、保健食品和清凉饮料等。

〔7〕、参加工程组织的平安生产检查，对检查中发现的问题及时进行整改。

〔8〕、发生因工伤亡及未遂事故要保护好现场，立即上报，并配合事故的调查。

质量员的平安职责

〔1〕、对因工程质量问题而导致发生伤亡事故负责

〔2〕、认真检验有关建筑材料的材质质量是否符合标准和设计要求，防止因材质问题而发生事故。

〔3〕、在施工过程中，监督施工作业，认真执行质量标准，防止不符合质量要求而导致发生平安事故。

预算员的平安职责

〔1〕、在本职业务范围内，对平安生产管理工作负责。

〔2〕、把平安生产列入经营承包的内容，并按照承包合同所规定的平安生产条款催促实施。

〔3〕、按照有关规定，负责在工程预算中计算提出平安技术措施费，并催促平安技术措施费专款专用。

材料员的平安职责

〔1〕、对施工现场实现平安生产所需的材料、机具要按方案保证供给。

〔2〕、对进入现场的劳保用品〔平安帽、平安带、平安网、漏电保护器等〕要认真检验。不合格品不准发放使用。

〔3〕、对进入现场的机具、材料等要按照现场平面布置图所规定位置摆放整齐。

班组长的平安职责

〔1〕、对本班组成员在施工作业中的平安负责，班组人员分散作业时，要实行大级工负责平安工作。

〔2〕、按照平安生产的规定、规程和要求，指导本班组人员平安作业。

〔3〕、认真执行平安技术交底，有权拒绝违章指挥的行为。

〔4〕、工作前要对所用的机具、设备、防护用品等作业场所进行平安检查，确认平安前方可工作。

〔5〕、组织本组人员开好班前、班后的平安会，并做好记录。

〔6〕、以身作那么，认真贯彻执行平安生产的有关规定，不违章指挥，不违章冒险作业，认真搞好本班组的平安生产。

〔7〕、本班组人员一旦发生事故，要立即向工长报告并做好保护现场、救治伤员等项相应工作。

施工作业人员的平安职责

〔1〕、认真学习贯彻地方平安法规和本公司平安生产制度，严格遵守平安技术操作规程。认真执行公司内的平安“标准化”的规定。

〔2〕、工作前要认真检查所用的机具、平安防护用品平安状况，工作中要时刻注意自己和他人的平安，对违章指挥、冒险作业的现象要坚决予以抵抗。

〔3〕、树立“平安第一，预防为主”的思想，防患于未然，严格执行“先平安后生产，不平安不生产“的原那么，作业中发现不平安隐患，要停止施工，立即向有关人员反映解决。

〔4〕、按时参加班前班后平安会，严格遵守劳动纪律，正确使用、保护和保管好防护用品。

〔四〕、制定各阶段平安文明施工措施

根据工程进度实际情况，制定和调整各阶段切合实际，符合平安文明施工标准要求的具体措施。

〔五〕、平安文明施工工作方案

1、开工准备

〔1〕、工程经理部平安文明施工组织机构

现场施工组织管理机构如下：

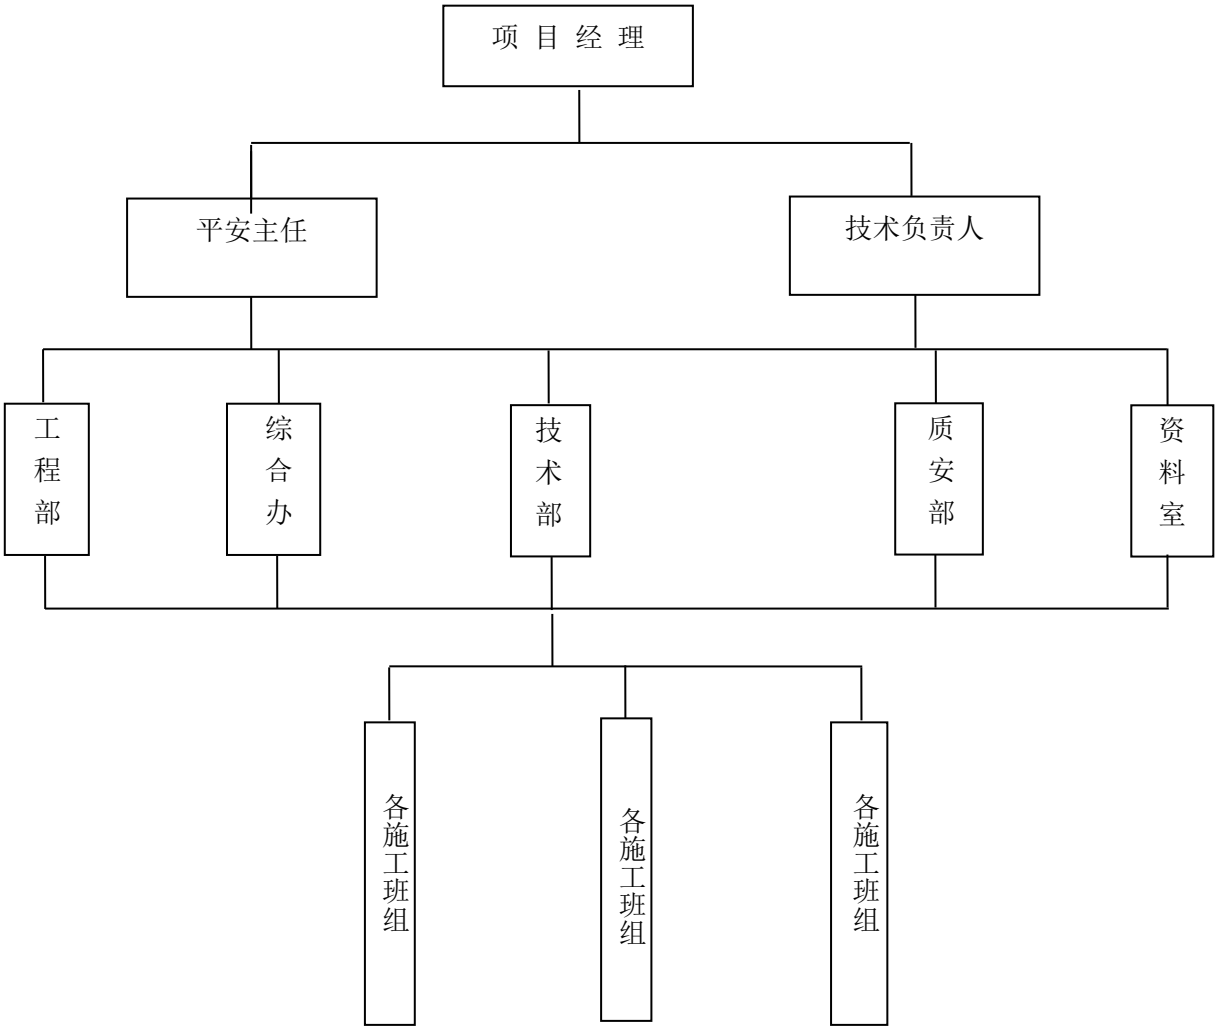

该工程将按工程法施工的原那么和要求，以工程领导小组为核心，认真地实施现场各基层生产经营小组平安文明生产责任制，严格管理，按标准和图纸要求，

统筹施工，确保平安文明施工。

〔2〕、建立工程部平安文明施工责任制

〔3〕、建立相应的平安文明资料袋

〔4〕、办公室布置

2、工程部严格执行《建设工程现场文明施工管理方法》。

3、办公室布置标准化、标准化。各种工程施工图表、证照齐备。同时采用微机进行电脑化管理，使大量的平安文明施工资料和工程资料的整理、编辑更加标准，详细完整齐全。充分表达了高素质施工企业现代化形象。

4、平安文明施工是社会开展，城市建设的需要，也是建筑企业形象的窗口，是企业取得社会认同的手段。工程部充分认识到树立企业良好形象的重要性和必要性，在工程施工初期就派专人负责现场规划，按有关要求，合理标准工地设施，建立警卫制，制作悬挂工程铭牌、企业标志。在工地施工现场内，也按规定建起符合平安文明施工要求的“图牌”，使工地平安生产、消防、卫生工作一目了然，起到了平安生产、文明施工的警示作用，提高职工的劳动生产平安意识和文明施工的自觉性。

〔六〕、工程施工过程

1、平安文明施工技术交底

2、检查平安文明施工的落实措施

3、执行部颁检查标准定期召开平安文明施工例会

〔七〕、平安文明施工总结

1、月度总结及制订方案

2、找出平安文明施工管理的薄弱环节，并提出改良措施

3、施工评比和申报

〔八〕、制定创平安文明工地制度

1、加强宣传，及时传达上级有关平安文明施工管理的精神，强化职工的平安文明施工意识。

2、参照合同有关规定制定具体措施，分工负责，实行奖惩制度。

3、定期或不定期派专职人员外出参观，向平安文明施工先进单位学习，吸收经验，不断改良。

四、平安施工保证措施

〔一〕、平安生产组织措施

〔1〕建立平安保证的三级体系，加强平安教育，工人上岗必须按规定进行三级平安教育，对特殊工种工人进行专业平安知识教育培训，对易出事故的行走机械及车辆司机要加强平安教育，树立平安第一的思想意识。

〔2〕树立“平安第一、预防为主”的思想，建全平安检查制度，班组每周进行一次平安检查，公司配合工程指挥组织每月进行一次工地平安全面大检查，对存在不平安因素的工段及班组责令停工整治，待隐患消除方可继续施工。

〔3〕新工人进场必须进行平安教育，并针对工程施工特点和分局部项工程生产的施工技能及应注意的平安事项，全面系统的对班组工人进行交底，以到达预防为主的目的。

〔4〕建立平安月检、旬检制度，由领导带头，做好每月一次月检，三次旬检，并配合公司季度检查; 工地班组轮流值日，做好日检，在检查中，做到有记录、有隐患通知，有整改资料。每月平安生产情况上报公司，整个工地建立平安监察网，工地设有平安领导小组，有专职平安员，班组有不脱产平安员，分工负责，在职在位，严格监察。

〔5〕进行技术交底的时候，必须有平安措施。

〔6〕平安与经济效益挂钩，建立平安奖罚制度，对违章造成严重后果者重罚，并予以行政行为。对遵守平安规定效益显著者，予以重奖。

〔7〕在方案、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，应进行方案、布置、检查、总结、评比平安工作。

〔6〕加强施工现场的施工平安，施工现场应配备有平安牌或警示牌，设置平安警示灯。

〔7〕加强现场施工的平安保卫生工作。进场后应和当地公安部门联系，做好暂住人口、外来人口的登记与管理工作。对工地办公地点、仓库等临时设施加强防盗、防火、防洪等平安措施。

〔二〕平安生产技术措施

1〕现场平安用电措施：

〔1〕、施工现场的一切用电设备的安装必须严格按施工组织设计进行。

〔2〕、供电干线、配电装置、发电房、配电房完工后，必须会同设计者、动力科、质安部共同检查验收合格后才允许通电运行。

〔3〕、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修、操作人员都必须符合JGJ46-2005施工现场临时用电平安技术标准要求。

〔4〕、接地装置必须在线路及配电装置投入运行前完工，并会同动力科及设计者共同检测其接地电阻值。接地电阻不合格者，严禁现场使用带有金属外壳的电器设备，并应增加人工接地体的数量，直至接地体完全合格为止。

〔5〕、施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中，必须采用TN-S接零保护系统。

〔6〕、保护零线应与工作零线分开，单独敷设，不作它用，保护零线PE必须采用绿/黄双色线。

〔7〕、保护零线必须在配电室配电线路中间和末端至少三处作重复接地，重复接地线应与保护零线相连接。

〔8〕、保护零线的截面应不小于工作零线截面的1/2，同时必须满足机械强度要求。

〔9〕、一切用电的施工机具运至现场后，必须由电工检测其绝缘电阻及检测各局部电气附件是否完整无损，绝缘电阻小于0.5欧或电气附件损坏的机具不得安装使用。

〔10〕、保护移动式设备的漏电开关、负荷线每周检查一次；保护固定使用设备的漏电开关应每月检查一次；防雷接地电阻每年三月一日前进行全面检测，并做好检查保养记录。

〔11〕、电气设备的正常情况下不带电的金属外壳等均应作保护接零。

〔12〕、施工现场的配电箱和开关箱至少配置两级漏电保护器，漏电保护器应选用电流动作型。

〔13〕、漏电保护器只能通过工作线，开关箱应实行一机一闸制。

〔14〕、配电系统中开关电器必须完好，设置牢固、端正。

〔15〕、带电导线接头间必须绝缘包扎，严禁挂压其它物体。

〔16〕、配电箱、开关箱应配锁，专人负责，定期检修。

〔17〕、检修人员必须遵守电工操作规程，使用绝缘工具，统一组织，专人

指挥。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/436142010031010105
