第一章 工程概况

工程名称： 板桥 A 地块一期】项目原则化附框施工工程(含原则化附框制作、安装、维保)

工程地点：南京市雨花台区凤舞路与宁芜路交叉路口

建设单位：南京市雨花城乡建设综合开发有限公司

工程范畴：板桥 A 地块一期】项目（1#~3#、12#、20#、21#、35#、62#商业和 61#幼儿园）原则化附框施工。

投标单位：常州华东装璜有限公司

建设工期：60 天

承包方式：包工包料

质量目的：合格

工程规模： 建筑面积 10 万平方米

第二章 施工布置

本工程集图纸设计、材料供应、加工制作及工程安装于一体。施工合理布置是顺利完毕本工程基本和保证，为此我公司将从中标即日起全力以赴投入到本工程实行工作上去，保证工程高质、安全、按期完毕。

一、 总体原则

1、保证在业主规定工期内完毕本工程，保证工程质量合格。

2、充分运用平面、空间和时间组织立体交叉作业，力求做到均衡施工。

3、认真贯彻执行国家和地方关于技术原则、规范、规程。

二、 项目组织指挥系统

为了保证工程顺利实行，必要强调总体协调工作，将集中具备丰富施工经验先进项目经理，构成项目经理部，从而保证本工程能在施工管理、施工技术上充分体现精品意识。本工程由曾做过类似工程项目经理担任项目经理，实行项目经理负责制。项目经理代表公司对外接受业主和监理指令和调度，协调外部各方关系和事务; 对内负责协调公司各种资源调度，配合工程进展，指挥和管理项目部内部各事务。

三、 施工准备

（一） 施工技术准备

1、 组织施工技术人员熟悉和学习图纸，理解时间上规定施工达到技术原则、明确工艺流程。

2、 进行图纸自审、会审等工作，做好施工图纸会审记录。

3、 施工前，依照图纸规定做好技术质量和安全施工交底工作。

4、 组织各专业施工组共同窗习图纸，商定施工中各专业工种配合。

5、 依照施工图纸规定，编制本工程各分某些项工程正式施工组织设计或施工方案，并组织关于施工人员进行方案交底。

6、 依照施工图纸、预算定额、施工组织设计、施工定额等文献，编制施工图预算和施工预算，为施工作业筹划编制、机具配备筹划和材料进场筹划编制、施工任务单和限额领料单签发提供根据。

（二）施工材料准备

依照施工图纸，为施工中所需各种物资资源生产和供应状况、价格、品种及运送路线等进行详细调查。由于市区施工交通道路和运送条件均受都市交通影响，为了减少交通阻塞，保证材料及时供应，对材料运送路线进行测设，研究各种运送方案。

1、 依照施工组织设计施工进度图和施工预算中工料分析，编制工程所需材料用量筹划及材料进场材料，作为备料、供料工作和拟定仓库，堆场面积及组织运送根据。

2、 依照材料需用量筹划和进场筹划，做好材料申请、订货和采购工作，使筹划得到贯彻。

3、 依照材料需用量筹划做好构配件加工、翻样工作，并按施工平面布置图规定做好堆放和保管工作。

（三）施工现场准备

1、 掌握施工阶段气象资料，以便综合组织全过程均衡施工，制定出雨天、大风天气施工办法。

2、 依照甲方提供地下原有管道及障碍物等资料，理解施工现场地下管道、障碍物状况。

3、 拟定施工范畴，做好围档，拆除地下、地面障碍物，贯彻地下管线改移、悬吊和保护办法，修建暂时设施，平整场地。

4、 在施工前，对施工用水、施工用电水源、电源等供应状况作详细调查，涉及给水电源、水量、压力、接管地点、供电能力、线路距离、负荷、停电状况等。

5、 架设动力和照明线路，接通施工用水管路，拟定材料、设备运送

线路。

6、 接通水、电源，现场水电工依照方案规定与安全操作规程敷设暂时地下给水管和电线（杆），将水、电送对各个用水用电地点，并做好现场排水工作。

7、 做好场区暂时排水及场地、道路硬化。

8、 按施工方案和施工平面布置图规定，搭设工地办公用房、会议室、值班室及安排好　其她生活设施和生产设施等。

9、 清除地面上障碍物，平整建筑物范畴以外施工用地，以便建筑材料堆放。

10、 布置好各材料堆场位置，并依照材料、构配件需用量筹划组织其进场，按施工平面布置图中规定地点堆放整洁，并做好材料登记、编号、标记和保护工作。

11、 在车道出入口设立洗车槽和三级过滤池，污水经沉砂井后流人市政下水道。

（四）施工队伍准备

1、 依照拟定现场管理机构建立项目施工管理层，并从公司挑选某些具备丰富建筑施工经验技术人员来担任本工程技术顾问、安全顾问和质量顾问，同步对本工程施工全过程进行监督。

2、 依照工程特点和施工进度筹划规定，拟定各施工阶段劳动力需用量筹划，并做好劳动力进场准备工作。

3、 依照各施工阶段劳动力需用量筹划，组织安排好详细人员，拟定详细进场时间，以保证施工持续性。

4、 对工人进行必要技术、安全、思想和法制教诲，教诲工作树立“

质量第一、安全第一”思想，遵守关于施工和安全技术法规、遵守地方、街道治安法规。

5、 在大批施工人员进场前，必要做好后勤工作安排，为职工衣、食、住、行、医予以全面考虑，并认真贯彻。

（五）作业条件准备

1、 向各施工班组进行筹划交底和技术交底，下达工程施工任务单，使各施工班组明确关于任务、质量、安全、进度等规定。

2、 做好工作面工作，检查道路、水平运送与否畅通，操作场合与否清理干净等。

3、 清查材料、构件质量、规格、数量与否与设计相符，并将其运至施工指定地点。

4、 贯彻施工场外运送道路。

5、 编制施工筹划、，安排好施工程序，协调好各工序及专业间配合工作。

（六）施工设备准备

1、 依照施工组织设计中拟定施工办法、施工机具、设备规定和数量以及施工进度安排，编制施工机具设备需用量筹划，组织施工机具需用量筹划贯彻，保证准时进场。

2、 依照施工机具需用量筹划，按施工平面布置图规定，组织施工机具设备进场，机械设备进场后，按规定地点和方式布置，并进行相应保护和试运转等工作。

3、 施工机具就位安装后，应对其进行试运转，并且通过公司关于部门验收，方可进行使用。

4、 施工机械应做好维护保养，应定期对机械设备进行检查，发现问题及时维修，保证施工机械安全正常进行。

四、 总体施工布置

1、施工任务安排

本工程按工程量来划分施工队伍，每支施工队伍分测量放线班、铝合金门窗安装班、玻璃安装班、打胶班。各班分若干个工作组，分别负责各自专业分项，对不同阶段、立面不同进行流水作业。一切工序必要依照安排综合进度筹划合理穿插作业。

2、总体施工顺序

在安排施工布置时必要分阶段确立重点项目，以保证综合均匀、配套施工。在施工布置中前期以铝合金门，塑钢窗外框安装为主，中期则投入重要施工力量进行铝合金门，塑钢窗内扇及玻璃块安装工作，后进行期铝合金，塑钢门窗防水解决、打胶、清洁工作。

第三章　现场施工工地布置

由于本工程施工所需铝合金门，塑钢窗等加工、拼装重要在工厂内完毕，只有小某些拼装需在现场进行。现场施工平面布置需业主提供一区域，解决现场办公室、库房、材料堆场等用地，总面积约300m^2。

一、　现场施工工地布置阐明

1、　项目部重要管理人员寻常办公用房约 50 m^2，重要有经理部人员现场办公和存储施工工具、配件用，保证项目施工寻常管理。

2、　重要材料暂时堆放场约 250 m^2 左右，半成品存储，做好安全、外面施工工作。

二、　暂时占地筹划表

用途	面积（m^2）	需要时间	用地位置
一、暂时堆场			

材料堆放区	250	材料进场至工程验收	施工现场
二、办公区			
寻常办公用房	50	材料进场至工程验收	施工现场

三、 电力、用水需求筹划表

用电/水位置	筹划用量	用途	需要时间	备注
各楼层		切割机、电焊机	材料进场至安装结束	
库房		照明	材料进场至工程验收	
生活区		照明	材料进场至工程验收	
		生活用水	材料进场至工程验收	

四、 施工平面布置图

1、 平面布置原则：

（1）在满足施工生产需要前提下，便于 1 用电安全，用水以便，排水畅通。


（2）材料、半成品装卸，尽量安顿在塔机覆盖范畴内，便于材料装卸及材料、半成品运送。

2、 现场平面布置：

我方现场施工用地位置以甲方提供实际场地为准，施工现场平面布置按施工进度分阶段灵活布置。



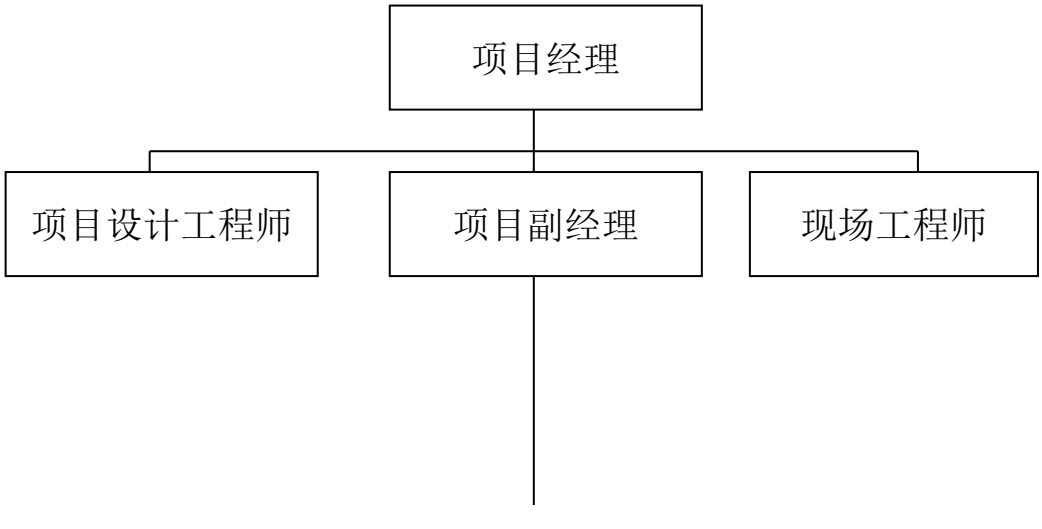
50㎡ 150㎡

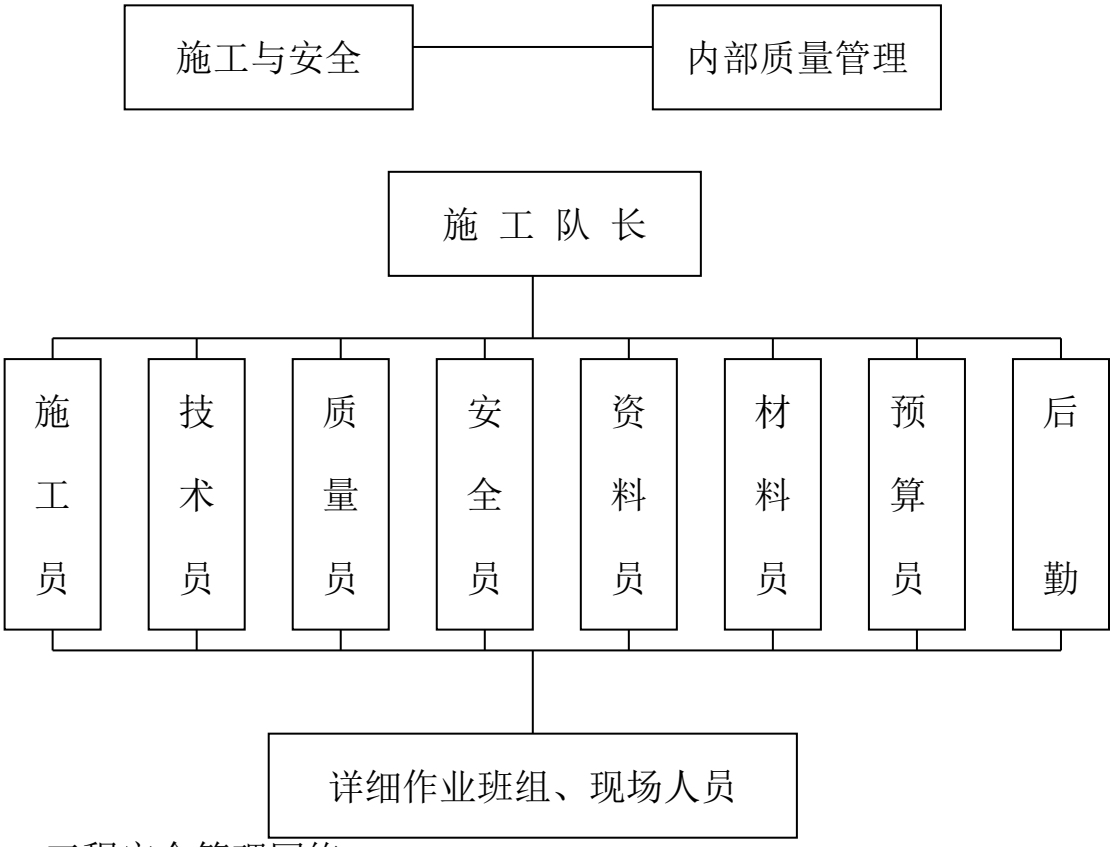


第四章　现场施工管理组织及劳动力配备筹划

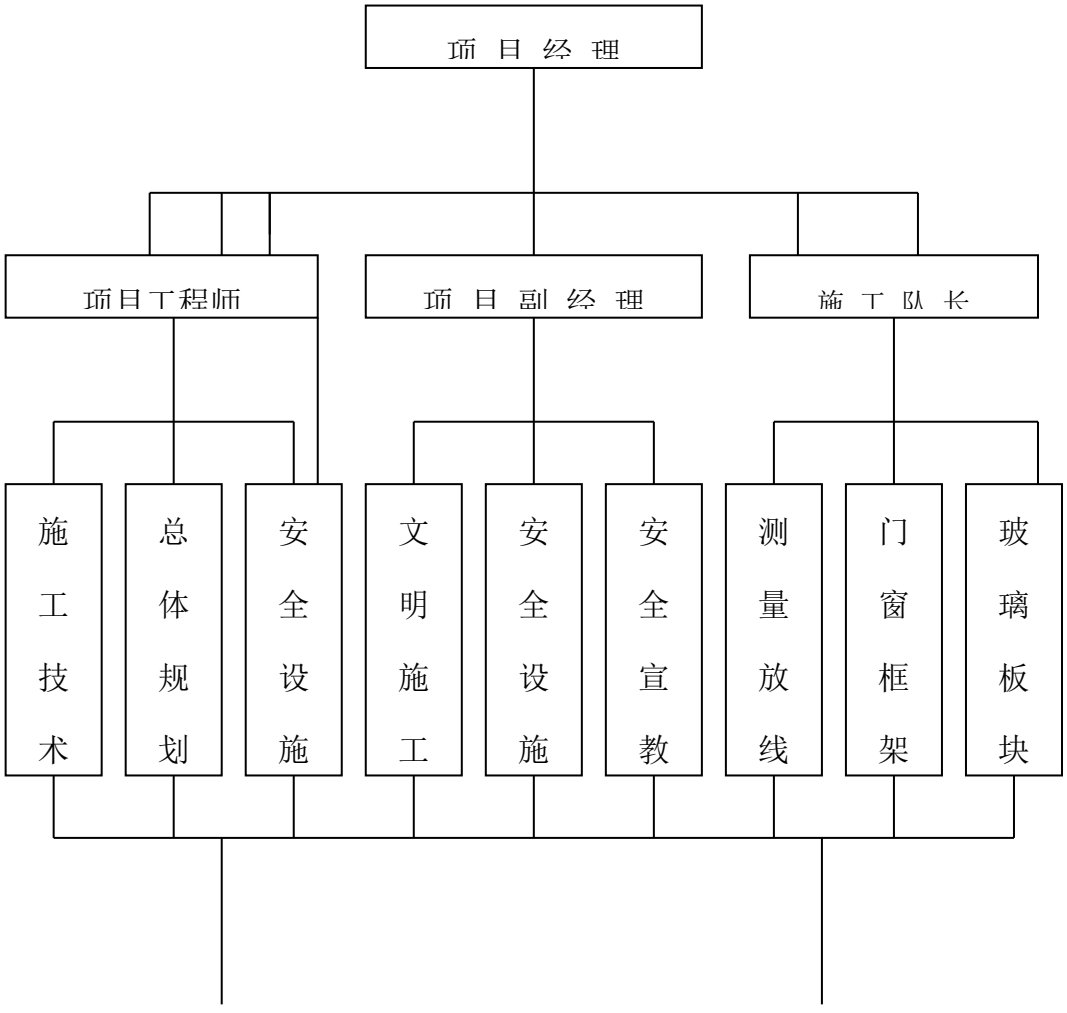
为了保证工程顺利实行，我公司将选排有经验工程人员和最先进工程技术人员构成“项目经理部”，从而使本项目铝合金门窗工程能在施工管理、施工技术上充分体现精品意识。本工程项目经理由近年从事铝合金门窗工程项目经理担任，实行项目经理负责制。项目经理代表公司对外接受业主和监理指令和调度，协调外部各方关系和事务；对内负责协调公司各种资源调度，配合工程进展，指挥和管理项目部内部各事务。

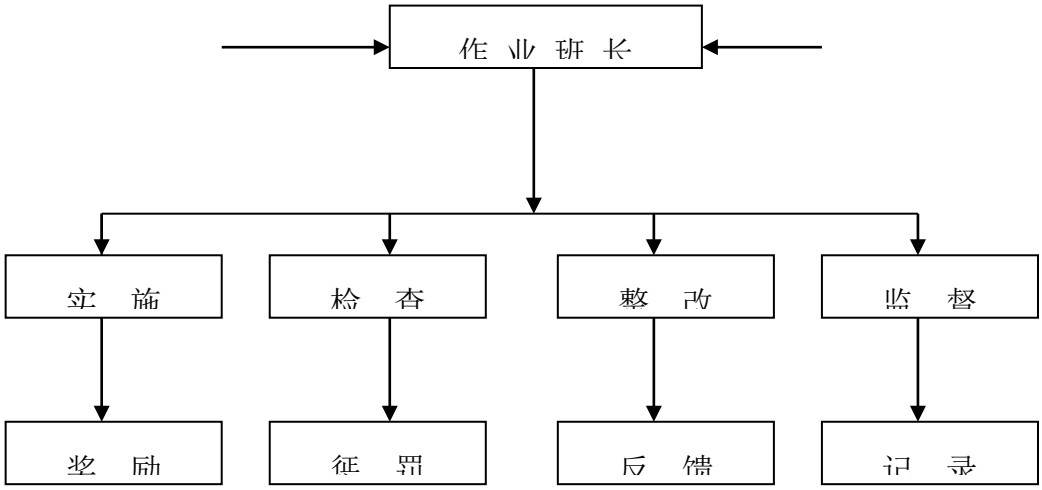
一、工程项目组织机构图



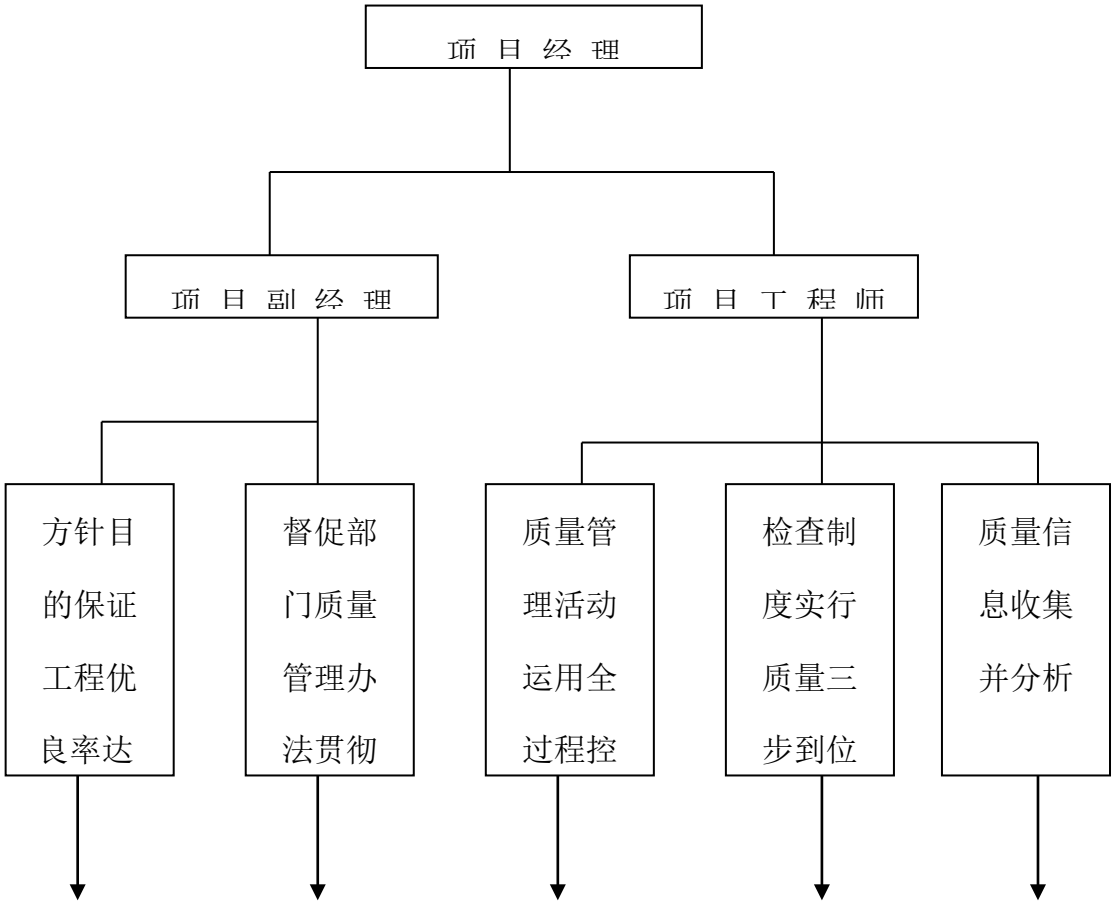

施工与安全
内部质量管理
施 工 队 长
施工员
技术员
质量员
安全员
资料员
材料员
预算员
后勤
详细作业班组、现场人员

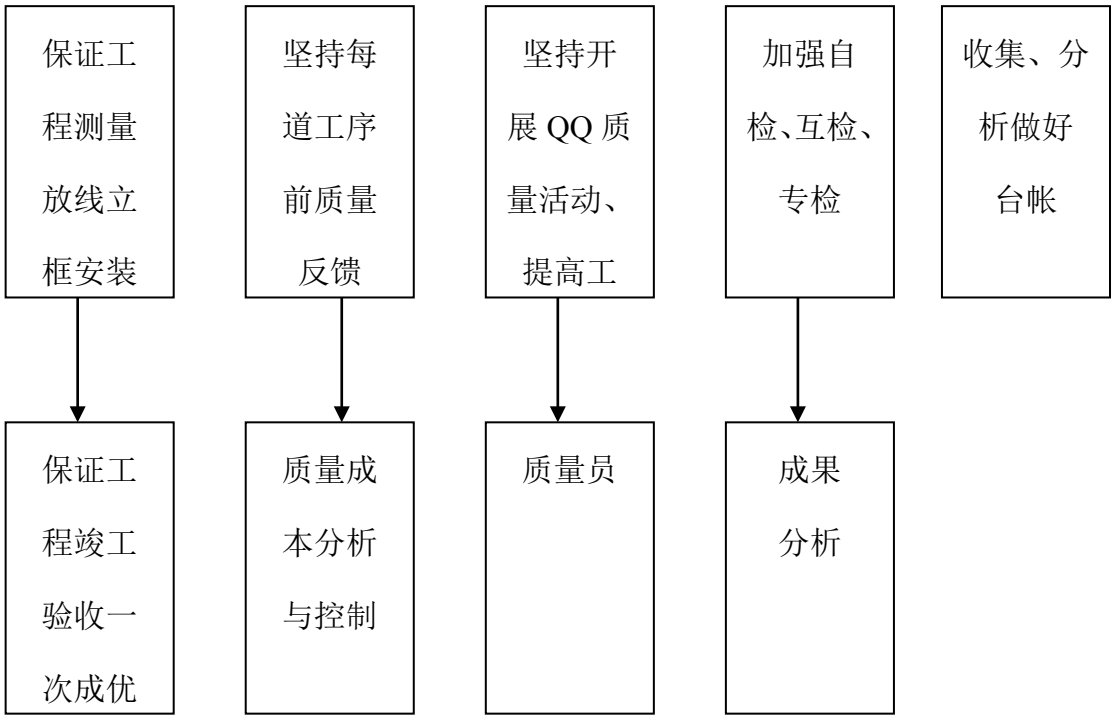
二、工程安全管理网络


项 目 经 理
项目工程师
项 目 副 经 理
施 工 队 长
施工技术
总体规划
安全设施
文明施工
安全设施
安全宣教
测量放线
门窗框架
玻璃板块


作 业 班 长
实 施
检 查
整 改
监 督
奖 励
惩 罚
反 馈
记 录

三、工程质量管理网络


项 目 经 理
项 目 副 经 理
项 目 工 程 师
方针目的保证工程优良率达
督促部门质量管理办法贯彻
质量管理活动运用全过程控
检查制度实行质量三步到位
质量信息收集并分析



四、项目管理构造组织阐明

1、 项目经理职责

（1）全面管理工程施工过程，对工程项目质量、安全、文明施工、工期和工程成本等全面负责。

（2）贯彻执行国家、省、市关于法律、法规和政策，执行公司各项管理制度。

（3）负责主持项目部寻常工作。

（4）依照施工进度状况，调节资金流动、材料设备供应、人力机械使用等筹划。

（5）组织制定项目管理机构各类管理人员职责、权限和项目管理规章制度并监督执行。

（6）执行经济责任书中项目经理负责履行各项条款。

（1）对工程项目施工进行有效控制，执行关于技术规范和原则，积极推广应用新技术，保证工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。

（2）运用当代化管理办法和应用新技术进行筹划、组织、指挥、协调、控制，实现项目管理目的。

（3）主持项目施工、质量例会，订立开、竣工报告。

（4）组织指挥本工程项目生产经营活动，调配并管理进入工程项目人力、资金、物资、机械设备等生产要素。

（5）安排施工作业队伍，并把好持证上岗关。

（6）负责制定项目质量目的，并贯彻目的贯彻、实行。

（7）向项目指挥部及工程总监报告项目部工作，按公司关于规定对项目实行管理。

（8）负责监督执行质量检查规程。

（9）负责质量三检，分析质量状况，掌握质量动态。各分项工程开工前作好质量规范规定布置会。

（10） 制定安全生产规章制度，监督安全生产规章制度贯彻贯彻，定期进行安全大检查。

（11） 组织三检制度，主持质量检查验评，督促工程验罢手续工作，对不合格品要及时返工，发生问题及时上报。

2、 技术总负责职责

（1）详细主持本工程现场图纸变更工作。

负责本工程技术管理工作，组织重大技术方案审核，解决施工过程中浮现重大技术问题。

（2）负责施工全过程技术指引与监控，负责监督执行 ISO9001 质量体系，组织施工图纸会审和技术交底。

（3）与业主、设计单位、监理公司保持密切沟通，保证设计、监理规定与指令在各工种中贯彻贯彻。

（4）组织技术骨干对本项目核心技术难题进行科研公关，贯彻加工制作、施工安装工艺，保证施工顺利进行。

3、 项目总调动职责

（1）负责组织和调度生产过程中所需工厂内加工人员、设备和材料。

（2）负责组织和调度生产，在保证质量前提下，全面完毕铝型材加工、玻璃加工、外协件加工等各项生产任务。

（3）负责按照施工进度规定，保证材料及时运送到位，以保工期。

（4）负责外协加工合同签定、管理及履行。

4、 项目副经理职责

（1）对项目经理负责，负责监督协调现场施工安装工作。

（2）认真贯彻公司及项目经理对本工程整体方案和技术办法，对工程成本、进度、质量和施工工艺严格把关。

（3）领导工人按图纸、施工规范进行施工，并经常进行检查，认真实行变更，及时提高局部构造优化方案，完善图纸确认手续。

5、 质控组职责

（1）收集整顿质量资料，对现场状况随时、随处进行监控，及时填

报分项工程质量检查评估报表，协助建立质量档案。

（2）按质量原则及时对工程质量进行验评，对不合格有权责令返工、停工，并将发生质量问题及经济损失如实上报。

（3）参加质量会议及质量检查，参加工程质量问题分析、调查和解决。

（4）积极协助领导开展全面质量管理，严格掌握质量原则，对检查评估工程质量负责，认真实行目的管理和全面质量管理。

（5）严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按照质量检查评估原则主持检查。

（6）严格掌握质量原则，坚持原则，对的及时反映质量状况。

6、 安全组职责

（1）协助领导做好安全管理工作，研究贯彻执行劳动保护和安全生产方针、政策、法令及规章制度。

（2）参加审查施工组织设计安全技术办法筹划，负责督促关于人员实行。

（3）进一步施工现场进行安全检查，解决生产中安全问题，制止违章指挥、违章作业，遇有严重问题有权责令其停工和整顿。

（4）与关于部门共同做好特种工人安全技术培训和考核发证工作。

（5）开展安全宣传活动，总结和推广安全生产先进经验，对职工进行安全教诲。

（6）开展防火教诲，提高员工防火意识，采用有效防火办法。

（7）配合管理好防火设施，一旦浮现危险性，及时采用抢险办法并报告关于部门。

7、 技术组职责

（1）详细负责工程项目技术管理工作，完毕本工程制作生产工艺和安装工艺，各项测试，验收工作以及设计、监理、总包技术文献解决。

（2）参加图纸会审及技术交底工作，解决施工现场浮现技术问题。

（3）对工程质量全面负责，指引工人按图纸、施工规范进行施工，并经常进行检查。

（4）认真履行全面质量管理，对项目技术资料进行系统化管理。

（5）严格按施工程序组织施工，及时填写施工日记、收集质量原始记录，随时掌握工程质量状况。

（6）认真执行质量规定及各种技术办法，组织三检，主持质量检查验评，督促工程验罢手续评估工作。

（7）支持质检员工作,对违背操作规程导致质量不合格要及时返工，发生问题要及时上报。

（8）认真组织贯彻贯彻安全生产规章制度，对所承担工程生产工作直接负责。

（9）编制、管理技术资料。

8、 材料设备组职责

（1）负责贯彻材料采购筹划，并与进场材料数量进行核对。

（2）依照工程施工进度筹划，调配、更换施工机械与材料。

（3）组织材料二次运送及材料保管、仓储。

（4）负责验证、收集、保管产品质保书、原则文献及有关技术资料。

（5）接受对上级职能部门指引、监督、检查。

9、 财务组职责

（1）负责本项目工程进度月报表核算与工程款核对。

（2）工程量复核， 做好阶段性结算工作。

（3）做好项目成本控制，合理组织资金周转。

（4）做好成本分析计算，为项目部提供决策根据。

10、 行政组职责

（1）加强项目基本管理及内外协调工作，强化信息传递。

（2）确立内部基本管理流程，制定岗位责任制，积累各类资料。

（3）做好文献收取、整顿、登记工作，并按规定进行审核、归档和保管。

（4）提供寻常生活后勤服务。

11、 现场施工队长职责

工地施工队长设多名，班组长若干名，负责执行项目经理所交代各项任务，重要是工地内外协调、施工人员安排管理、工程进度检查、施工日报表，工地消防、安全等工作，对项目经理负责，其正式参加本工程时间从工地进场前 1～2 周至工程验收为止。

12、 现场质检员职责

质检员必要具备实际施工经验，负责执行项目副经理交付任务，其重要任务为进场材料质量检查，施工质量检测，施工问题发现，进行施工质量全过程控制。

13、 现场安全员职责

安全员必要具备工地施工安全管理经验，负责执行项目副经理交付工地安全巡逻任务，，遵循公司安全管理条例开展工作，保证安全生产、文明施工。

14、 现场设备员职责

设备员必要具备工地惯用设备保养、维护和管理经验，负责工地各种设备维护和保养，遵循公司设备管理条例开展工作，保证安全生产、文明施工。

15、 现场材料员职责

材料必要熟悉工程所用各种材料，依照工地施工进度状况，制定各种材料采购和供应筹划，据项目经理审批后，交材料设备组，并对材料进行全面管理。

16、 现场资料员职责

负责收集和整顿整个施工过程中各种关于施工资料和会议记录，涉及各方往来文献等。

17、 现场工地防火员职责

依照本工程特点，特设防火员全过程进行施工现场巡逻。防火员须熟悉有关防火规定，全面负责施工现场防火安全，履行《中华人民共和国消防条例实行细则》第十九条所规定九项重要职责，且遵循防火安全规定执行工作。

18、 现场测量员职责

负责协调配合专业测量单位进行施工测量，同步积极认真地在施工全过程中掌握和控制测量方面工作。

19、 现场安装工人职责

有三年以上铝合金门窗安装施工经验，熟悉铝合金门，塑钢窗安装程序以及工地管理常识，综合知识较强，身体强健。工人进场前必要进行全面体检，身体合格后方可进入施工现场，对特殊工种安装工人，必要持证上岗。

六、重要施工人员构成

机构	名称	姓名	职务	职称	重要资历、经验及承担过项目
	项目主管		项目经理	工程师	从事本行业施工管理
	分管技术负责人	王鸣亮	总工程师	工程师	从事本行业施工技术、设计
	设计师	卞晓勇	设计部主任	工程师	从事本行业施工技术、设计 8 年
	项目经理	杨兆定	项目经理	工程师	无锡市长江国际花园、无锡市新梁溪人家、无锡市唐周巷安居工程等工程
	项目副经理	顾国俭	项目副经理	工程师	
	项目工程师	徐月桂	项目工程师	助工	
	质量管理	杨政华	质量主管	助工	
	材料管理	杨焕定	材料部经理	助工	

	安全管理	杨兆定	安全主管	技术员	
	筹划管理	彭才智	筹划主管	助工	
	分项负责人	曾凡武	施工队长	助工	

七、劳动力配备筹划表

依照现场施工安排，各阶段劳动力安排如下表：

类别	工种	按工程施工阶段投入安排劳动力状况							
		深化设计	备料定货	放线	结构制安	门窗	玻璃制安	打胶清理	验收
管理人员	项目经理	1	1	1	1	1	1	1	1
	项目副经理	1	1	1	1	1	1	1	1
	项目工程师	4	1	2	2	1	1	1	1
	施工员			4	4	4	4	4	4
	质安员	2	2	2	2	2	2	2	2
	材料员		2		2	2	2	2	2

施工人员	电工			1	1	1	1	1	1
	划线工			5	3	1	1	1	
	钳工				1	1		1	
	电焊工				4	2	2	2	
	油漆工				1	1		1	
	安装工			8	20	40	40	4	4
	检查工			2	2	2	2	2	2
	打胶工						4	8	1
	清洁人员								30

第五章 筹划投入重要机械设备机其进场筹划

一、 车间设备配备

名称	型号	数量
拼角机	X00L2-4	2
仿形机	LSX-30F2	2
端面铣	LSX-200	2
电焊机	BC-500	6
冲床	JB23-63	8
钻床	Z512-2	4
双头切割机	DG-102	3
电动切割机	SAW-C-15FB	5
万能多头钻床	KT-368	1
塑钢三维切割机		3

V 型机	3

一、 施工现场设备配备

名称	型号	数量
冲击电锤		8
玻璃吸盘		30
台钻		4
电焊机		3
手枪钻		25
打胶枪		25
拉铆枪		15
钢卷尺		40
直角尺		10
角向砂轮机		4
自攻螺丝钻		8
自动打胶枪		2
玻璃吸吊机		2
激光经纬仪		2
高精度水准仪		2
手提式切割机		4
对讲机		

车间配备设备在生产制作铝合金门窗时使用，施工现场设备配备在施工人员进场时提前二天进场，工程所有竣工后退场。

第六章　材料采购机供应筹划

一、材料采购

工程材料由采购部依照技术组提供材料种类、规格、数量、质量规定和工程部提供工期规定和材料数量,与材料供应商初步拟定材料供货合同，待施工图纸拟定后，依照工程部提供工程预算和工期规定与供应商签定供货合同，进入实际供货操作阶段，材料供应商要保证构件加工和现场安装进度需要。

在施工前，按照施工人员数量并依照我市安全站规定预订安全帽，并贯彻现场配电箱规定和供货渠道。同步，联系解决好脚手架提供与搭设问题，贯彻零星材料和工具供货。

二、材料供应进场筹划

本工程由于规模较大，工期较紧，并且整个工程分项多，范畴大，因此对材料必要有详细供应筹划，按材料筹划分批合理到场，在保证材料及时供应同步，亦要注意减轻现场库存压力。筹划不但要保证材料先后供应材料，颜色和品种一致，并且也要保证资金统筹安排和合理配备。

第七章 施工进度筹划机工期保证办法

一、施工进度筹划机施工工期

由于本工期较紧，必要对进度筹划进行合理安排，各工序紧密衔接，有效调动、合理运用各资源，保证施工工期在筹划内。依照进度安排，在施工条件满足状况下，本工程施工工期将依照招标方总体施工进度筹划进行。

施工进度筹划表

序号	项目	准备期			施工期													
1	深化设计	10	5	2	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84
2	业主审批																	
3	现场施工准备																	
5	测量放线																	
6	材料采购																	

7	塑木副框加工																	
9	副框安装																	
14	清场、竣工验收																	
15	施工总工期																	

二、施工工期保证办法

（一）有效控制影响工期因素

依照本工程特点，为保证该工程项目能按筹划顺利、有序地进行，并达到预定目的，必要对有也许影响工程进度因素进行分析，事先采用办法，尽量缩小实际进度偏差，实现对项目工期控制。影响该项目进度重要因素有资金因素、技术因素、材料和设备因素、人员因素、现场施工因素等，对于上述影响工期诸多因素，咱们将按事前、事中、事后控制原则，分别对这些因素加以分析、研究、制定对策，以保证工期按期完毕。

1、资金储备充分

编制详细资金使用筹划，周密合理安排资金，做到专款专用，保证工地有充分资金周转，保证工程顺利进行。在整个施工工程中，准备一笔储备资金，以应对也许发生工地资金局限性或资金划拨中浮现时间差，决不因而而影响工期安排。

材料、机具、设备供应跟上

重要材料由项目部统一采购、统一调度、统一供应。必要制定详细材料供应筹划，以保证材料及时供应。

施工中依照施工筹划和施工预算中工料分析，编制工程材料、构件机有关设备需用量筹划，作为定货、备料、供料和拟定仓库、堆场面积及组织运送根据。按筹划分批进场，并做好进场验收、发放和保管工作。

依照施工筹划，针对本工程特点合理组织施工机械调配。施工过程中要加强设备维修管理，提高机械设备完好率和单机效率，并做好机械设备综合运用，提高其效率。

3、　　劳动力配备合理

就施工项目而言，劳动力配备根据是施工进度筹划。

项目部专项工程调度小组，同样也负责工程劳动力调配，保证劳动力供应均衡，劳动资源强度恰当，在施工高峰期有足够能力实现进度规定。

调配劳动力应积极可靠，让工人有超额完毕也许，以获得奖励，进而激发出饱满劳动热情。

尽量使劳动组织保持相对稳定，防止频繁调动。在劳动组织不适应任务规定期，应敢于打乱原建制进行优化组合。

4、现场施工管理办法得力

（1）　在工程中履行项目经理责任制，严格执行合同规定，加强监督管理，保证工程在合同工期内完毕。

（2）　在工程中充分运用工作面平行作业；同步合理划分流水段，由各种施工队作业。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/627032156103006066
