输电线路隐蔽工程签证记录表模板

一、隐蔽工程签证目的

隐蔽工程施工质量管理，是工程建设质量管理的一个重要环节，工序施工质量控制是保证整个工程建设质量的重要环节，隐蔽工程质量签证是监理质量控制的重要依据和手段。鉴于 110kV~750kV 输电线路工程施工及验收规范中，没有对输电线路施工过程中隐蔽工程签证表格做出具体规定，借鉴以往工程管理经验，现对输电线路工程隐蔽工程签证记录表进行统一规范。在对隐蔽工程签证时，要求施工项目部填写一式两份，及时由各方签证人员签字完善，并交一份监理项目部留存，作为监理对隐蔽工程质量管理的依据。

二、隐蔽工程签证清单

输电线路隐蔽工程签证记录表共计 26 份，具体如下：

1、各种基础型式地基验槽 9 份（普通基础；承台基础；岩石嵌固、掏挖基础；人工挖孔基础；单腿多孔基础；钢管杆基础；锚杆基础；灌注桩成孔；挡土墙）。

2、各种基础浇前、支模 6 份（板式基础；锚杆基础；钢管杆基础；岩石掏挖基础；人工挖孔基础；承台、连梁基础）。

3、各种基础浇制 6 份（板式基础；钢管杆基础；岩石掏挖基础；人工挖孔基础；单腿多孔；灌注桩基础）。

4、各种基础拆模 1 份。

5、各种接地装置埋设 2 份（水平接地埋设；垂直接地埋设）。

6、各种压接管压接 2 份（接续管压接、耐张管压接）。

1.隐蔽工程（普通基础地基验槽）签证记录表

工程名称:

致：_____监理项目部：

施工桩号_____，基础型式(　　)；基础各部位开挖几何尺寸均符合设计数据，请检查。设计变更：_____。

A 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

B 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

C 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

D 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

以下内容由施工项目部质检员填写,监理人员现场检查签证：

序号	检查内容	标准	检查结果（mm）			
		允许误差（mm）	A	B	C	D
1	坑底地质	设计地质				
		实际地质				
2	地基承载力	设计值				
		实测值				
3	基础坑深（mm）	设计值				
		实际值				
4	坑口尺寸（mm）	设计值				
		实测值				
5	坑底板尺寸（mm）	设计值				
		实测值				

A 腿设计意见：	B 腿设计意见：	C 腿设计意见：	D 腿设计意见：
设计代表：_____ 年　月　日	设计代表：_____ 年　月　日	设计代表：_____ 年　月　日	设计代表：_____ 年　月　日

A 腿监理意见： 监理人员：_____ 年　月　日	B 腿监理意见： 监理人员：_____ 年　月　日	C 腿监理意见： 监理人员：_____ 年　月　日	D 腿监理意见： 监理人员：_____ 年　月　日
运行单位意见： 运行代表：　　年　月　日			

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 基础型式若同一基四个腿基础相同，则填写统一的基础型号，反之，如四个腿基础不一样，应按照设计分别填写 A、B、C、D 腿基础型式；如：A：DB3645　B：DB3242C：DB4257　　D：DB3645。

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 坑底地质栏：检查结果栏分别填写设计地质和实际地质。

8. 地基承载力栏：如设计图纸要求，应在检查结果栏分别填写设计值和试验值；如设计图纸未要求填写“/”。

9. 基础坑深栏：检查结果栏分别填写设计值和实测值。

10. 坑口尺寸栏：根据设计图纸要求，确定放坡系数；在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如 6500×6500

11. 坑底板尺寸栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如 3500×3500

12. 设计单位意见栏：填写“现场地质或地基承载力符合设计图纸要求”。

13. 监理意见栏：填写“符合设计图纸及规范要求，同意进入下道工序”。

14. 运行单位意见栏：填写“符合设计图纸要求”。

15. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。

16. 施工、设计、监理按单腿检查时间填写。

2.隐蔽工程（承台地基验槽）签证记录表

工程名称:

致：_____监理项目部：

施工桩号_____，基础型式(　　)；基础各部位开挖几何尺寸均符合设计数据，请检查。设计变更：_____。

A 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

B 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

C 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

D 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

以下内容由施工项目部质检员填写,监理人员现场检查签证：

序号	检查内容	标准	检查结果（mm）			
		允许误差（mm）	A	B	C	D
1	坑底地质	设计地质				
		实际地质				
2	基础坑深（mm）	设计值				
		实际值				
3	坑口尺寸（mm）	设计值				
		实测值				
4	坑底板尺寸（mm）	设计值				
		实测值				

A 腿设计意见：	B 腿设计意见：	C 腿设计意见：	D 腿设计意见：

设计代表： 年　月　日	设计代表： 年　月　日	设计代表： 年　月　日	设计代表： 年　月　日
A 腿监理意见： 监理人员： 年　月　日	B 腿监理意见： 监理人员： 年　月　日	C 腿监理意见： 监理人员： 年　月　日	D 腿监理意见： 监理人员： 年　月　日
运行单位意见： 运行代表：　　年　月　日			

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 基础型式与设计图纸一致。

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 坑底地质栏：检查结果栏分别填写设计地质和实际地质。

8. 基础坑深栏：检查结果栏分别填写设计值和实测值。

9. 坑口尺寸栏：根据设计图纸要求，确定放坡系数；在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如 6500×6500

10. 坑底板尺寸栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如 3500×3500

11. 设计单位意见栏：填写“现场地质符合设计图纸要求”。

12. 监理意见栏：填写“符合设计图纸及规范要求，同意进入下道工序”。

13. 运行单位意见栏：填写“符合设计图纸要求”。

14. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。

15. 施工、设计、监理按单腿检查时间填写。

3.隐蔽工程（岩石嵌固、掏挖基础地基验槽）签证记录表

工程名称:

致：_____监理项目部：

施工桩号_____，基础型式(　　)；基础各部位开挖几何尺寸均符合设计数据，请检查。设计变更：_____。

A 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

B 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

C 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

D 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

以下内容由施工项目部质检员填写,监理人员现场检查签证：

序号	检查内容	标准		检查结果（mm）			
		允许误差（mm）		A	B	C	D
1	土质、岩石性能	设计地质					
		实际地质					
2	基础埋深（mm）	+100、0	设计值				
			实际值				
3	坑口直径（mm）	-0.8%	设计值				
			实测值				
4	扩孔直径×	+100	设计值				

	扩孔高度（mm）		实测值				
5	平基（mm）	设计值					
		实测值					
6	护壁（mm）	设计值					
		实测值					

设计单位意见：

设计代表：　　年　月　日

A 腿监理意见：	B 腿监理意见：	C 腿监理意见：	D 腿监理意见：
监理人员：_____ 年　月　日	监理人员：_____ 年　月　日	监理人员：_____ 年　月　日	监理人员：_____ 年　月　日

运行意见：

运行代表：　　年　月　日

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 基础型式若同一基四个腿基础相同，则填写统一的基础型号，反之，如四个腿基础不一样，应按照设计分别填写 A、B、C、D 腿基础型式；如：A：TW3262　B：TW2860C：TW2660　　D：TW3265。

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 土质、岩石性能栏：检查结果栏分别填写设计地质和实际地质。

8. 基础埋深栏：检查结果栏分别填写设计值和实测值**（注最小埋深起算点）**。

9. 坑口直径栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如φ1400

10. 扩孔直径×扩孔高度栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如φ2000×1200×300

11. 平基栏：在检查结果栏中设计值填写“/”，实测值填写“长度×宽度×高度”。如 3000×3000×900

12. 护壁栏：在检查结果栏中设计值填写“ /”，实测值填写“厚度×高度”。如◎150×3000

13. 设计单位意见栏：填写“现场地质或嵌岩深度符合设计图纸要求”。

14. 监理意见栏：填写“符合设计图纸及规范要求，同意进入下道工序”。

15. 运行单位意见栏：填写“符合设计图纸要求”。

16. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。

17. 施工、监理按单腿检查时间填写。

4.隐蔽工程（人工挖孔基础地基验槽）签证记录表

工程名称:

致：_____监理项目部:

施工桩号_____，基础型式(　　)；基础各部位开挖几何尺寸均符合设计数据，请检查。设计变更：_____。

A 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

B 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

C 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

D 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

以下内容由施工项目部质检员填写,监理人员现场检查签证:

序号	检查内容	标准		检查结果（mm）			
		允许误差（mm）		A	B	C	D
1	土质、岩石性能	设计地质					
		实际地质					
2	基础埋深	+100、0	设计值				

<table>
<tr><td></td><td>（mm）</td><td></td><td>实际值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">坑口直径
（mm）</td><td rowspan="2">-0.8%</td><td>设计值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实测值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">坑底直径×
扩孔高度
（mm）</td><td rowspan="2">+100</td><td>设计值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实测值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">平基
（mm）</td><td colspan="2">设计值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实测值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">护壁
（mm）</td><td colspan="2">设计值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实测值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">设计意见：

设计代表：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">A 腿监理意见：

监理人员：_____
年　月　日</td><td colspan="2">B 腿监理意见：

监理人员：_____
年　月　日</td><td colspan="2">C 腿监理意见：

监理人员：_____
年　月　日</td><td colspan="2">D 腿监理意见：

监理人员：_____
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="8">运行意见：

运行代表：　　年　月　日</td></tr>
</table>

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 基础型式若同一基四个腿基础相同，则填写统一的基础型号，反之，如四个腿基础不一样，应按照设计分别填写 A、B、C、D 腿基础型式；如：A：WKZ16110　B：WKZ14100　C：WKZ16105　D：WKZ1290。

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 土质、岩石性能栏：检查结果栏分别按分层填写设计地质和实际地质。如 0-0.5 米黏土，0.5-3 米强风化泥岩，3 米以下中风化泥岩。

8. 基础埋深栏：检查结果栏分别填写设计值和实测值**（注最小埋深起算点）**。

9. 坑口直径栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如φ1400

10. 坑底直径×扩孔高度栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值（如φ2000×1200）；如无扩孔则填桩径。

11. 平基栏：在检查结果栏中设计值填写“/”，实测值填写“长度×宽度×高度”。如 3000×3000×900

12. 护壁栏：在检查结果栏中设计值填写“/”，实测值填写“厚度×高度”。如◎150×3000

13. 设计单位意见栏：填写“现场地质或嵌岩深度符合设计图纸要求”。

14. 监理意见栏：填写“符合设计图纸及规范要求，同意进入下道工序”。

15. 运行单位意见栏：填写“符合设计图纸要求”。

16. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。

17. 施工、监理按单腿检查时间填写。

5.隐蔽工程（单腿多孔基础地基验槽）签证记录表

工程名称：

致：_____监理项目部：

施工桩号_____，基础型式(　　)；基础各部位开挖几何尺寸均符合设计数据，请检查。设计变更：_____。

A1 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

A2 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

A3 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

A4 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

以下内容由施工项目部质检员填写,监理人员现场检查签证：

序	检查内容	标准	检查结果（mm）

号		允许误差（mm）		A1	A2	A3	A4
1	土质、岩石性能	设计地质					
		实际地质					
2	基础埋深（mm）	+100、0	设计值				
			实际值				
3	坑口直径（mm）	-0.8%	设计值				
			实测值				
4	坑底直径（mm）	+100	设计值				
			实测值				
5	护壁（mm）	设计值					
		实测值					

设计意见：

设计代表：　　年　　月　　日

A1 腿监理意见：	A2 腿监理意见：	A3 腿监理意见：	A4 腿监理意见：
监理人员：———————— 年　　月　　日	监理人员：———————— 年　　月　　日	监理人员：———————— 年　　月　　日	监理人员：———————— 年　　月　　日

运行意见：

运行代表：　　年　　月　　日

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 基础型式为验收基础腿基础型式。

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 土质、岩石性能栏：检查结果栏分别按分层填写设计地质和实际地质。如 0-0.5 米黏土，0.5-3 米强风化泥岩，3 米以下中风化泥岩。

8. 基础埋深栏：检查结果栏分别填写设计值和实测值。

9. 坑口直径栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如φ1400

10. 坑底直径栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如φ2000

11. 护壁栏：在检查结果栏中设计值填写“/”，实测值填写“厚度×高度”。如◎150×3000

12. 设计单位意见栏：填写“现场地质符合设计图纸要求”。

13. 监理意见栏：填写“符合设计图纸及规范要求，同意进入下道工序”。

14. 运行单位意见栏：填写“符合设计图纸要求”。

15. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。

16. 施工、监理按单孔检查时间填写。

6. 隐蔽工程（钢管杆基础地基验槽）签证记录表

工程名称：

致：_____监理项目部：

施工桩号_____，基础型式(　　)；基础各部位开挖几何尺寸均符合设计数据，请检查。设计变更：_____。

项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

以下内容由施工项目部质检员填写,监理人员现场检查签证：

序号	检查内容	标准		检查结果（mm）
		允许误差（mm）		
1	土质、岩石性能	设计地质		
		实际地质		
2	基础埋深（mm）	+100、0	设计值	
			实际值	
3	坑口直径（mm）	-0.8%	设计值	
			实测值	
4	坑底直径×扩孔高度（mm）	+100	设计值	
			实测值	
5	平基（mm）	设计值		
		实测值		
6	护壁（mm）	设计值		
		实测值		

设计意见：

设计代表：　　年　　月　　日

监理意见：

监理人员：　　年　　月　　日

运行意见：

运行代表：　　年　　月　　日

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 基础型式按与设计图纸一致。

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 土质、岩石性能栏：检查结果栏分别按分层填写设计地质和实际地质。如 0-0.5 米黏土，0.5-3 米强风化泥岩，3 米以下中风化泥岩。

8. 基础埋深栏：检查结果栏分别填写设计值和实测值（注最小埋深起算点)。

9. 坑口直径栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如φ1400

10. 坑底直径×扩孔高度栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值（如φ2000×1200)；如无扩孔则填桩径。

11. 平基栏：在检查结果栏中设计值填写“/”，实测值填写“长度×宽度×高度”。如 3000×3000×900

12. 护壁栏：在检查结果栏中设计值填写“ /”，实测值填写“厚度×高度”。如◎150×3000

13. 设计单位意见栏：填写“现场地质符合设计图纸要求”。

14. 监理意见栏：填写“符合设计图纸及规范要求，同意进入下道工序”。

15. 运行单位意见栏：填写“符合设计图纸要求”。

16. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷)，不可用私章代替。

7.隐蔽工程（锚杆基础地基验槽）签证记录表


工程名称:

致：_____监理项目部:

施工桩号_____，基础型式(　　)；基础各部位钻孔几何尺寸均符合设计数据，请检查。设计变更：_____。

x 腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

以下内容由施工项目部质检员填写,监理人员现场检查签证:
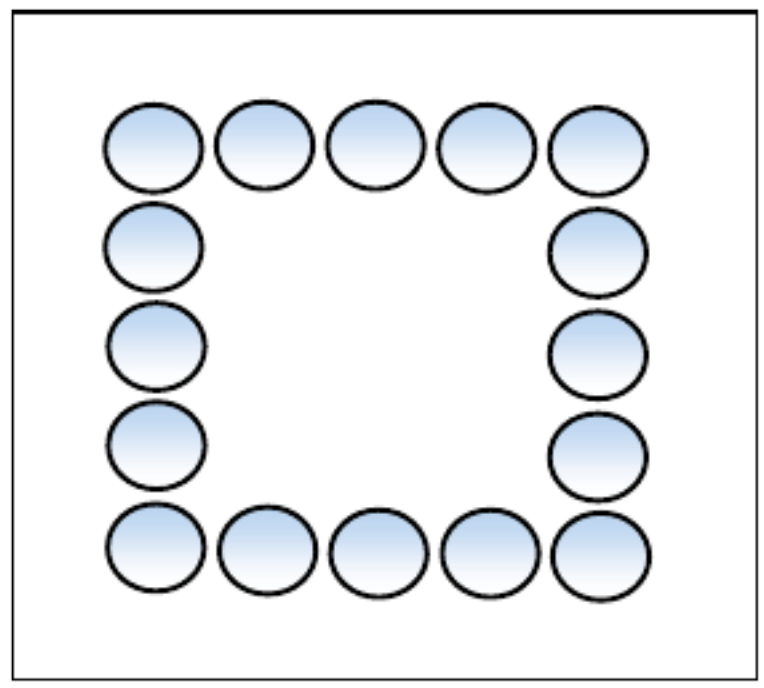
<table>
<tr><td>序号</td><td>检查内容</td><td>腿 别</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">岩石性能</td><td>设计地质</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>实际地质</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td>锚孔深度（mm）
设计:
实际:</td><td colspan="3" rowspan="5">锚孔示意图:

</td></tr>
<tr><td>锚孔数量（个）
设计:
实际:</td></tr>
<tr><td>锚孔孔径（mm）
设计:
实际:</td></tr>
<tr><td>锚孔间距（mm）
设计:
实际:</td></tr>
<tr><td>锚孔边距（mm）
设计:
实际:</td></tr>
<tr><td colspan="5">设计意见:

设计代表:　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="5">x 腿监理意见:

监理人员:　　年　月　日</td></tr>
</table>

运行意见： 运行代表：　　年　　月　　日

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 基础型式分别按单腿填写；如：A：MG3542。

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 腿别栏：按现场实际基础腿填写。

8. 岩石性能栏：检查结果栏分别按分层填写设计地质和实际地质。如 2 米强风化泥岩，2 米以下中风化泥岩。**（注：要求钻孔时取出的岩石按顺序摆放在现场，分别标记单孔号）**

9. 锚孔深度以现场检查最短孔为准按实填写。如 6000mm

10. 锚孔数量按实填写。如 16 个

11. 锚孔孔径按实填写。如φ150

12. 锚孔间距按实填写。如 350mm

13. 锚孔边距按实填写。如 1200mm

14. 设计单位意见栏：填写“岩石性能符合设计图纸要求”。

15. 监理意见栏：填写“符合设计图纸及规范要求，同意进入下道工序”。

16. 运行单位意见栏：填写“符合设计图纸要求”。

17. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。

8.隐蔽工程（机械钻孔灌注桩成孔）签证记录表

工程名称:

致：_____监理项目部：

施工桩号_____，基础型式(　　)；灌注桩成孔质量符合规范要求，请检查。设计变更：_____。

A 腿项目部专职质检员：_____　　施工队质检员：_____　　_____年___月___日

B 腿项目部专职质检员：_____　　施工队质检员：_____　　_____年___月___日

C 腿项目部专职质检员：_____　　施工队质检员：_____　　_____年___月___日

D 腿项目部专职质检员：_____　　施工队质检员：_____　　_____年___月___日

以下内容由施工项目部质检员填写,监理人员现场检查签证：

序号	检查内容	标准		检查结果（mm）			
		允许误差（mm）		A	B	C	D
1	孔深（mm）	不小于设计深度	设计值				
			实际值				
2	孔径（mm）	-50	设计值				
			实测值				
3	孔垂直度（mm）	小于桩长 1%					

设计意见：

设计代表：　　年　　月　　日

A 腿监理意见：	B 腿监理意见：	C 腿监理意见：	D 腿监理意见：

监理人员：_____ 年　月　日	监理人员：_____ 年　月　日	监理人员：_____ 年　月　日	监理人员：_____ 年　月　日
运行意见： 运行代表：　　年　月　日			

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 基础型式若同一基四个腿基础相同，则填写统一的基础型号，反之，如四个腿基础不一样，应按照设计分别填写A、B、C、D 腿基础型式；如：A：GZ22180　B：GZ20160　C：GZ20180　D：GZ24200。如为每腿多孔时，按每腿填写， A1、A2、A3、A4 等。

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 孔深栏：检查结果栏分别填写设计值和实测值。

8. 孔径栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如Φ2200

9. 孔垂直度栏：在检查结果栏分别填写实测值。如 300

10. 设计单位意见栏：填写“符合设计图纸要求”。

11. 监理意见栏：填写“符合设计图纸及规范要求，同意进入下道工序”。

12. 运行单位意见栏：填写“符合设计图纸要求”。

13. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。


14. 施工、监理按单腿检查时间填写。

9.隐蔽工程（挡墙地基验槽）签证记录表


工程名称:

<table>
<tr><td colspan="5">致：_____ 监理项目部：
施工桩号_____，挡墙型式(　　)；挡墙基槽开挖各种尺寸均符合设计数据，请检查。设计变更：_____。
项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日
以下内容由施工项目部质检员填写,监理人员现场检查签证：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">序号</td><td rowspan="2">检查内容</td><td colspan="2">标准</td><td>检查结果（mm）</td></tr>
<tr><td colspan="2">允许误差（mm）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">地质情况</td><td colspan="2">设计地质</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实际地质</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">挡墙埋深（mm）</td><td rowspan="2">符合设计要求</td><td>设计值</td><td></td></tr>
<tr><td>实际值</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">沟槽尺寸（mm）</td><td rowspan="2">符合设计要求</td><td>设计值</td><td></td></tr>
<tr><td>实测值</td><td></td></tr>
</table>

开挖示意图：

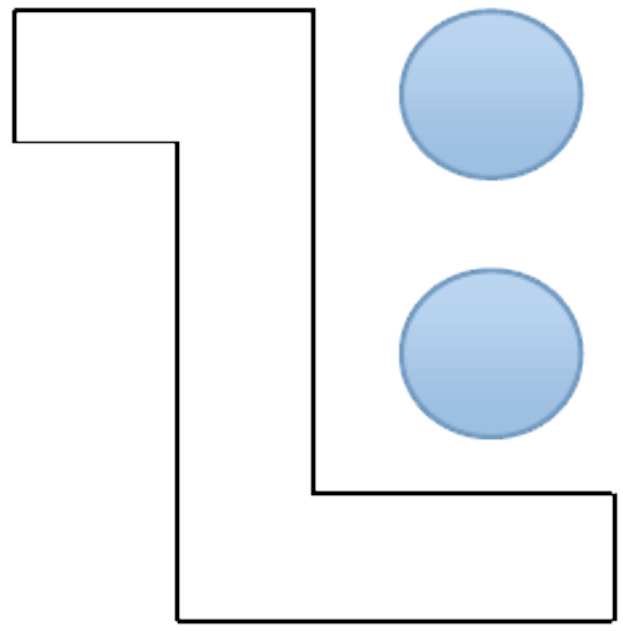

平面图

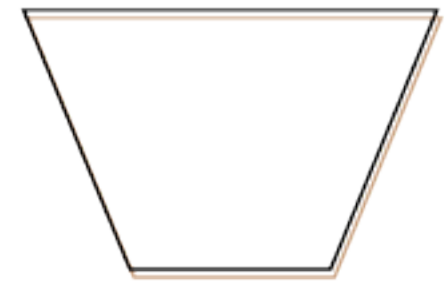

截面图

监理意见：

监理人员：　　年　　月　　日

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致。如： G1、T1 等

4. 挡土墙型式按设计图纸要求填写。如： Ⅰ型（Ⅱ型）

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 地质情况栏：如与设计地质一致，就填持力层的地质状况；如不一致，通知设计处理，并按实填写。

8. 埋深栏：检查结果栏分别填写设计值和实测值（**根据设计型式确定**）。

9. 沟槽尺寸栏：在检查结果栏分别填写设计值和实测值 （**根据设计型式确定**）。如 2000×1200

10. 监理意见栏：填写“符合设计图纸要求，同意进入下道工序”。

11. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。

10.隐蔽工程（板式基础浇前、支模）签证记录表

工程名称：

致：_____监理项目部：

施工桩号_____，基础型式(　　)；基础钢筋数量、规格、绑扎、支模各种尺寸均符合设计数据，砂、石、水泥、水和施工工器具均已准备齐全，具备浇制条件，请检查。设计变更：_____。

A腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

B腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

C腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

D腿项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年___月___日

以下内容由施工项目部项目部质检员填写,监理人员现场检查签证：

序号	监理检查内容	标准		检查结果（mm）			
		允许误差（mm）		A	B	C	D
1	立柱断面尺寸（mm）	-0.8%	设计值				
			实测值				
2	地脚螺栓或插入角钢数量、规格、长度（mm）	符合设计要求	设计值				
			实测值				
3	地脚螺栓露出基面高度	+10、-5	设计值				
			实测值				
4	地脚螺栓小根开（mm）	±2	设计值				

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>实测值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">主筋数量、规格、长度（mm）</td><td rowspan="2">符合设计要求</td><td>设计值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实测值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">主筋箍筋数量及规格</td><td rowspan="2">符合设计要求</td><td>设计值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实测值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">上层底板筋数量、规格、长度（mm）</td><td rowspan="2">符合设计要求</td><td>设计值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实测值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">下层底板筋数量、规格、长度（mm）</td><td rowspan="2">符合设计要求</td><td>设计值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实测值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>底板筋、箍筋末端弯钩</td><td colspan="2">符合设计及规范要求</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">钢筋保护层厚度</td><td rowspan="2">-5</td><td>设计值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实测值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>钢筋表面质量</td><td colspan="2">干净、平直</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>钢筋接头数量及扭矩值</td><td colspan="2">符合设计及规范要求</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>13</td><td>模板安装</td><td colspan="2">牢固可靠</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>转角预高值（mm）</td><td colspan="2">符合设计要求</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">15</td><td rowspan="6">坑中心根开、对角线尺寸（mm）</td><td rowspan="6">螺栓式：±2‰，±1.6‰
高塔：±0.7‰,±0.6‰</td><td rowspan="2">设计值</td><td>AB</td><td>BC</td><td colspan="2">CD</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>实测值</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">设计值</td><td>DA</td><td>AC</td><td colspan="2">BD</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>实测值</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">A 腿监理意见：

监理人员：_____
年 月 日</td><td colspan="2">B 腿监理意见：

监理人员：_____
年 月 日</td><td colspan="2">C 腿监理意见：

监理人员：_____
年 月 日</td><td colspan="2">D 腿监理意见：

监理人员：_____
年 月 日</td></tr>
</table>

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 基础型式：与设计图纸一致，不同基础型式时应分别填写；

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 立柱断面尺寸栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为现场实际测量值。如方形断面填写为“1400×1400”；圆形断面填写为“Φ1400”。

8.地脚螺栓或插入角钢的数量、规格、长度（mm）栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为现场地脚螺栓实际测量值。如 4M64*2537

9.地脚螺栓露出基面高度栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为现场地脚螺栓露高实际测量值。

10. 地脚螺栓小根开栏：4 条地脚螺栓填写为“360×360”;8 条地脚螺栓的小根开用相邻两地脚螺栓的间距 S1 、S2 和对边距 S3 表述， 填写为 S1/S2/S3（240/320/560）;12 条或 16 条地脚螺栓（圆形分布）用“分布直径/相邻两地脚螺栓间距 S 表述，填写为Φ540/200”。

11.主筋、箍筋数量、规格及长度栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为实际测量值。填写方式为 44 B25*6500 或 44 C25*6500

12.主筋箍筋数量、规格栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为实际测量值。填写方式为 44 A14*3527

13.上、下层底板筋数量、规格、长度栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为实际测量值。填写方式为 44 B22*4200 或 44 C22*4200

14.钢筋保护层厚度栏：填写实测值。

15.钢筋表面质量栏：填写“干净、平直”。

16. 钢筋接头数量及扭矩值栏：填写“见附件”;

17.模板安装栏：填写“牢固可靠”。

18.转角预高值栏：对留有预高基础腿分别填写实际值，未留预高的基础腿填写“/”。

19.坑中心根开、对角线尺寸栏：对于平腿基础设计值与施工图纸一致，如 AB：5006+5006 BC：5006+5006，实测值按现场测量数据填写；对于高低腿基础设计值和实测值分别填写两水平半根开值，如：AB：5006+6005 BC：6005+5006。

20. 监理意见栏：填写“合格，同意浇筑”。

21. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。

22. 施工、监理按单腿检查时间填写。

11. 隐蔽工程（锚杆基础承台浇前、支模）签证记录表

工程名称：

致：_____监理项目部：

施工桩号_____，承台钢筋及地脚螺栓数量、规格符合设计要求，钢筋、地脚螺栓及模板安装满足规范要求；砂、石、水泥、水和搅拌机等工器具均已运到桩位，请现场监督检查。设计变更：_____。

A 腿项目部专职质检员：_____　施工班组质检员：_____　_____年___月___日

B 腿项目部专职质检员：_____　施工班组质检员：_____　_____年___月___日

C 腿项目部专职质检员：_____　施工班组质检员：_____　_____年___月___日

D 腿项目部专职质检员：_____　施工班组质检员：_____　_____年___月___日

以下内容由施工项目部项目部质检员填写，监理人员现场检查签证：

序号	监理检查内容	标准		检查结果（mm）			
		允许误差（mm）		A	B	C	D
1	立柱断面尺寸（mm）	-0.8%	设计值				

			实测值				
2	地脚螺栓或插入角钢数量、规格、长度（mm）	符合设计要求	设计值				
			实测值				
3	地脚螺栓露出基面高度	+10、-5	设计值				
			实测值				
4	地脚螺栓小根开	±2	设计值				
			实测值				
5	主筋数量、规格、长度（mm）	符合设计要求	设计值				
			实测值				
6	主筋箍筋数量及规格	符合设计要求	设计值				
			实测值				
7	上层底板筋数量、规格、长度（mm）	符合设计要求	设计值				
			实测值				
8	下层底板筋数量、规格、长度（mm）	符合设计要求	设计值				
			实测值				
9	底板筋、箍筋末端弯钩	符合设计及规范要求					
10	钢筋保护层厚度	-5	设计值				
			实测值				
11	钢筋表面质量	干净、平直					
12	钢筋接头数量及扭矩值	符合设计及规范要求					
13	模板安装	牢固可靠					
14	转角预高值	符合设计要求					
15	坑中心根开、对角线尺寸（mm）	螺栓式：±2‰，±1.6‰ 高塔：±0.7‰,±0.6‰	设计值	AB	BC	CD	
			实测值				
			设计值	DA	AC	BD	
			实测值				
16	锚杆抗拔试验	符合设计要求					

A 腿监理意见： 监理人员：———————— 年　月　日	B 腿监理意见： 监理人员：———————— 年　月　日	C 腿监理意见： 监理人员：———————— 年　月　日	D 腿监理意见： 监理人员：———————— 年　月　日

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

5. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

6. 立柱断面尺寸栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为现场实际测量值。如方形断面填写为“1400×1400”；圆形断面填写为“Φ1400”。

7. 地脚螺栓或插入角钢的数量、规格、长度（ mm）栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为现场地脚螺栓实际测量值。如 4M64*2537

8. 地脚螺栓露出基面高度栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为现场地脚螺栓露高实际测量值。

9. 地脚螺栓小根开栏：4 条地脚螺栓填写为“360×360”；8 条地脚螺栓的小根开用相邻两地脚螺栓的间距 S1 、S2 和对边距 S3 表述， 填写为 S1/S2/S3（240/320/560）;12 条或 16 条地脚螺栓（圆形分布）用“分布直径/相邻两地脚螺栓间距 S 表述，填写为Φ540/200”。

10. 主筋、箍筋数量、规格及长度栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为实际测量值。填写方式为 44 B25*6500 或 44 C25*6500

11. 主筋箍筋数量、规格栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为实际测量值。填写方式为 44 A14*3527

12. 上、下层底板筋数量、规格、长度栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为实际测量值。填写方式为 44 B22*4200 或 44 C22*4200

13. 钢筋保护层厚度栏：填写实测值。

14. 钢筋表面质量栏：填写“干净、平直”。

15. 钢筋接头数量及扭矩值栏：填写“见附件”；

16. 模板安装栏：填写“牢固可靠”。

17. 转角预高值栏：对留有预高基础腿分别填写实际值，未留预高的基础腿填写“/”。

18. 坑中心根开、对角线尺寸栏：对于平腿基础设计值与施工图纸一致，如 AB：

5006+5006　BC：5006+5006，实测值按现场测量数据填写；对于高低腿基础设计值和实测值分别填写两水平半根开值，如：AB：5006+6005　BC：6005+5006。

17.锚杆抗拔试验栏：填写实测抗拔试验值（如135MPa）满足设计要求。

18.监理意见栏：填写“合格，同意浇筑”。

19.记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。

20.施工、监理按单腿检查时间填写。

12.隐蔽工程（钢管杆基础浇前、支模）签证记录表

工程名称：

致：_____监理项目部：

施工桩号_____，基础型式(　　)；基础钢筋数量、规格、绑扎、支模各种尺寸均符合设计数据，砂、石、水泥、水和施工工器具均已准备齐全，具备浇制条件，请检查。设计变更：_____。

项目部专职质检员：_____　　施工班组质检员：_____　　_____年__月__日

以下内容由施工项目部质检员填写,监理人员现场检查签证：

序号	监理检查内容	标准 允许误差（mm）		检查结果（mm）
1	立柱断面尺寸（mm）	-0.8%	设计值	
			实测值	
2	地脚螺栓数量、规格、长度（mm）	符合设计要求	设计值	
			实测值	
3	地脚螺栓露出基面高度	+10、-5	设计值	
			实测值	
4	地脚螺栓小根开	±2	设计值	
			实测值	
5	主筋数量、规格、长度（mm）	符合设计要求	设计值	
			实测值	
7	内箍筋筋数量、规格、长度（mm）	符合设计要求	设计值	
			实测值	
8	外箍筋数量、规格、长度（mm）	符合设计要求	设计值	
			实测值	
10	钢筋保护层厚度	-5	设计值	
			实测值	
11	钢筋表面质量	干净、平直		
12	钢筋接头数量及扭矩值	符合设计及规范要求		
13	模板安装	牢固可靠		

监理意见：

监理人员：_____　　年　　月　　日

填写说明

1. 工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。

2. 监理项目部应写全称并与公章对应。

3. 施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致；如： G1、T1 等。

4. 基础型式：与设计图纸一致，不同基础型式时应分别填写；

5. 设计变更如有应填写设计变更图号；没有则填“无”。

6. 日期应填写完整；如xxxx 年xx 月xx 日。

7. 立柱断面尺寸栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为现场实际测量值。如方形断面填写为“1400×1400”；圆形断面填写为“Φ1400”。

8. 地脚螺栓或插入角钢的数量、规格、长度（ mm）栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为现场地脚螺栓实际测量值。如 24M68*2537

9. 地脚螺栓露出基面高度栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为现场地脚螺栓露高实际测量值。

10. 地脚螺栓小根开栏： 12 条及以上地脚螺栓（圆形分布）用“分布直径/相邻两地脚螺栓间距S 表述，填写为Φ540/200”。

11. 主筋、箍筋数量、规格及长度栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为实际测量值。填写方式为 44 B25*6500 或44 C25*6500

12. 内箍筋数量、规格、长度栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为实际测量值。填写方式为 9A18*5200、9B18*5200 或9 C16*5200。

13. 外箍筋数量、规格、长度栏：设计值应按设计图纸要求填写，实测值为实际测量值。填写方式为 1A10*2512345。

14. 钢筋保护层厚度栏：填写实测值。

15. 钢筋表面质量栏：填写“干净、平直”。

16. 钢筋接头数量及扭矩值栏：填写“见附件”；

17. 模板安装栏：填写“牢固可靠”。

18. 监理意见栏：填写“合格，同意浇筑”。

19. 记录表签字栏，签字人必须亲笔签名（字迹正楷），不可用私章代替。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/686015234203010104
